



2025 Geschäftsbericht



2025 Jahresbericht

1 Zusammenfassung

Das Wasserwerk Reinach und Umgebung kann wiederum auf ein erfolgreiches Betriebsjahr zurückschauen. Der Betrieb der Anlagen war jederzeit gewährleistet. Dies auch dank der umfassenden Instandhaltung und dem gut geführten Betrieb der Anlagen, die der Brunnenmeister Daniel Gutzwiller mit seinem Team der Gemeinde Reinach, im Auftrag des WWR&U wiederum wahrgenommen hat.

Erfreulicherweise waren auf dem rund 61,5 Kilometer umfassenden Versorgungsnetz des WWR&U keine Leitungsbrüche zu verzeichnen. Dennoch soll in den kommenden Jahren weiter in den Leitungsersatz investiert werden, primär rund um das «Herzstück», dem Reservoir Froloo. Derzeit wird dafür eine Mehrjahreserneuerungsplanung erarbeitet, die das Leitungsalter, die Materialisierung, die Schadensrate, aber auch die finanziellen und personellen Möglichkeiten zur Umsetzbarkeit mitberücksichtigt.

Zur Erweiterung und Instandhaltung der Transportleitungen, Reservoir und Pumpwerke, investierte das WWR&U im Berichtsjahr insgesamt CHF 1'255'559.06. Bei Leitungserneuerungen werden, wo möglich, betriebliche Synergien mit Bauvorhaben Dritter genutzt, beispielsweise auf Kantons- und Gemeindestrassen.

Im vergangenen Jahr wurde mit der Überführung der alten WQS-Dokumentation in das Selbstkontrollkonzept «W12» vom Fachverband für Wasser, Gas und Wärme (SVGW) gestartet. Dazu wurden sämtliche Anlagen des WWR&U begangen und deren Zustand und notwendige Verbesserungsmaßnahmen erfasst und bewertet. Zudem wurden die Instandhaltungsarbeiten und -intervalle definiert und in ein IT-Tool eingearbeitet. Künftig kann damit deren Erledigung dokumentiert oder bei Abweichungen weitere Massnahmen geplant werden. Ebenfalls in diesem System ist die Versickerungsanlage Aesch abgebildet, welche die Grundwasseranreicherung für die Wasserversorgungen im Birstal sicherstellt und vom WWR&U betrieben wird.

Die regionale Zusammenarbeit mit der Hardwasser AG und den IWB hat sich im Jahr 2025 weiter gefestigt. So leitete unter anderem eine Mitarbeiterin der Hardwasser AG die Einführung des Selbstkontrollkonzepts nach W12 und ein Mitarbeiter der IWB die Einführung der Instandhaltungssoftware. Damit ist das WWR&U im Verbund mit den beiden grossen Wasserversorgern der Region gut eingebunden und für die Zukunft bestens aufgestellt.



Im Jahr 2025 beging das Wasserwerk Reinach und Umgebung sein 50-jähriges Bestehen in der heutigen Struktur. Zu diesem Anlass öffneten wir am 23. August 2025 unsere Türen und luden die Bevölkerung ein, ihre regionale Wasserversorgung besser kennenzulernen. Gezeigt wurde das Pumpwerk Widen, in welchem das Wasser der Hardwasser AG zugeleitet und nach Reinach und Arlesheim verteilt wird. Zudem hatten die Besucher die Möglichkeit in einem Pumpwerk in der Reinacher Heide einen Blick ins Grundwasser zu werfen. Grösster Publikumsmagnet war zweifelsohne das Reservoir Froloo, wo eine leere Trinkwasserkammer begangen und besichtigt werden konnte. Gesamthaft durften wir gegen 1000 durchwegs interessierte Trinkwasserkonsumentinnen und -konsumenten an diesem Tag in unseren Anlagen begrüßen.

Der Abschluss des Jubiläumsjahrs bildete ein festlicher Anlass im Heimatmuseum Reinach. Geladen waren ehemalige und aktuelle

Gremienmitglieder sowie die Mitarbeitenden. Durch den Abend führte die regional bekannte Historikerin und Journalistin Fabia Maieroni, die einen amüsanten Rückblick auf die Geschichte des WWR&U warf. Abgerundet wurde der gemütliche Anlass mit einem feinen Es-sen unseres bewährten Cateringteams und musikalischen Einlagen einer Jazz-Combo.

2 Tätigkeit der Organe

Im Jahr 2025 standen keine Neuwahlen in die Gremien an. Durch einen Departementswechsel im Gemeinderat Therwil ersetzt jedoch Claudia Degen Hettenbach, Beat Zahno im Ausschuss und in der Kommission. Für die Amtsperiode 2024 - 2028 und per 31. Dezember 2025 sind von den Gemeinden folgende Organmitglieder des WWR&U delegiert:

Name	Vorname	Gemeinde	VA	VK	Rev
Bringold	Ernst	Bottmingen		✓	
Brodmann	Georg	Ettingen		✓	
Buess	Brigitte	Oberwil			✓
Bürki	Markus	Bottmingen			✓
Degen	Claudia	Therwil	✓	✓	
Diener	Mike	Reinach		✓	
Felber	Stefan	Biel-Benken	✓	✓	
Fuchs	Martin	Biel-Benken			✓
Giacomini	Philippe	Ettingen			✓
Huber	Markus	Reinach		✓	
Künti	Urs	Reinach		✓	
Layer	Christoph	Reinach			✓
Lopez	Felix	Oberwil		✓	
Muntwiler	Sibylle	Ettingen		✓	

Rudin	Otto	Reinach		✓	
Ryser	Hanspeter	Oberwil (Präsidium)	✓	✓	
Schmid	Andreas	Therwil			✓
Schumacher*	René	WHL		✓	
Seiler	Felix	Therwil		✓	
Straumann	Reto	Therwil		✓	
Thanei	Peter	Oberwil		✓	
Vögeli	Doris	Reinach (Vizepräs.)	✓	✓	
Weller	Robert	Bottmingen	✓	✓	

*Mitglied ohne Stimm-/Wahlrecht

Traditionsgemäss findet einmal pro Amtsperiode eine Weiterbildungsreise für die Gremienmitglieder statt, welche die Teilnehmenden diesmal via Zentralschweiz ins Tessin führte.

Der Auftakt der dreitägigen Reise bildete der Besuch des neuen Quellwasserwerks der Wasserversorgung Luzern. In diesem wird das Wasser aus dem Eigental und Entlebuch mit Keramikfiltern aufbereitet.

Nach einem Mittagessen in Beckenried liessen wir uns das Projekt der Seeaufschüttung im Gebiet des Reussdeltas in Flüelen erklären. Dort wird Ausbruchmaterial aus verschiedenen Tunnelbauwerken genutzt, um das Delta der Reuss wieder in seiner ursprünglichen Ausdehnung aufzuschütten. Damit entsteht ein einzigartiger Lebensraum für Pflanzen, Amphibien und Fische, aber auch ein Naherholungs- und Badegebiet.

Tags darauf stand eine Kraftwerkbesuch bei den Bleniowerken und nach einer kurzen Wanderung ein Besuch der Wasserversorgung von Bellinzona auf dem Programm. Der kulturelle Abschluss unserer Legislaturreise bildete am Samstag eine Stadtführung durch Bellinzona mit Burg, Altstadt und Markt.

Im Berichtsjahr hielten der Verwaltungsausschuss (VA) fünf, die Verwaltungskommission (VK) vier und die Revisoren (Rev) eine Sitzung/en ab. Zudem erfolgte ein Zirkulationsantrag z.Hd. des Verwaltungsausschusses.

Neben den regelmässigen Berichten über Trinkwasserverbrauch, Rohrbrüche, Qualitätsuntersuchungen und dem Fortschritt der Projekte wurden in den Sitzungen die folgenden weiteren Themen behandelt und dazu Beschlüsse gefasst:

- Mehrere Vergabeanträge zu grösseren Rohrleitungsbauprojekten in Oberwil und Bottmingen.
- Genehmigung Budget und Jahresrechnung

Auf die im Jahr 2025 umgesetzten Projekte, über die in den Gremien regelmässig berichtet wurde, wird in Kapitel 5 im Detail eingegangen.

Die Funktionen im Wasserwerk Reinach und Umgebung sind wie folgt besetzt:

Name	Vorname	Funktion	Arbeitgeber
Meier	Thomas	Werkleitung	Hardwasser AG/IWB
Rickenbacher	Andreas	Werkleitung Stv.	Hardwasser AG/IWB
Gutzwiller	Daniel	Brunnenmeister	Gemeinde Reinach
Indermitte	Martin	Werkingenieur	Aegerter&Bosshardt AG
Beutler	Yolanda	Finanzen	Gemeinde Reinach
Berger	Jacqueline	Administration	Hardwasser AG

3 Trinkwasserdaten

3.1 Wasserbezug

Die Trinkwassernachfrage der sechs versorgten Gemeinden und des Wasserverbands Hinteres Leimental betrug im Jahr 2025 4'393'733m³ und lag damit rund 4,5% höher als im Vorjahr. Von der Hardwasser AG hat das Wasserwerk Reinach und Umgebung 1'013'505m³ Trinkwasser bezogen.

Der mittlere Tagesbezug aller WWR-Gemeinden betrug im Berichtsjahr 12'038 m³/d (Vorjahr 10'714m³/d). Der mittlere Wasserbezug pro Person und Tag lag bei 204 Liter (Vorjahr 185 Liter). Die maximale Tagesfördermenge aller WWR-Grundwasserpumpwerke wurde am 30. Juni 2025 mit 22'467 m³/d (Vorjahr 23'488 m³/d) gemessen. Die maximale Spitzenabgabemenge wurde am 2. Juli 2025 mit 19'991 m³/d (Vorjahr 17'918 m³/d) erzielt. Das entspricht einem «Spitzenverbrauch pro Kopf» von 338 Litern pro Tag (Vorjahr 305 Liter).

Der Trinkwasserbezug des Wasserverbands Hinteres Leimental (WHL) beim WWR&U fiel im Berichtsjahr mit 155'042m³ knapp 6% höher aus als im Vorjahr (147'042m³).

3.2 Trinkwasserqualität

Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen Basel-Landschaft (ALV BL) führte wiederum, im Auftrag des Wasserwerks Reinach und Umgebung, periodisch chemische und bakteriologische Wasseruntersuchungen im gesamten Versorgungsgebiet durch. Die Probenahmen fanden dabei abwechselnd, entlang der gesamten Prozesskette, von der Trinkwassergewinnung (Pumpwerke) über die Speicherung (Reservoir) und die Verteilung (Netz WWR&U) sowie in den kommunalen Verteilnetzen statt.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 203 Trinkwasserproben auf bakteriologische Parameter untersucht und elf davon wurden zusätzlich

einer chemischen Analyse unterzogen. Beanstandet wurde eine bakteriologische Probe, wobei die anschliessend durchgeführte Nachkontrolle alle gesetzlichen Qualitätsvorgaben erfüllte.

Das WWR&U veröffentlicht seit 2004 quartalsweise eine Zusammenfassung der Trinkwasseranalysen in den regionalen Medien und auf den Websites www.wwr.ch und www.trinkwasser.ch.

Die per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) waren auch im Jahr 2025 mehrfach ein Thema in den Medien.


Das Trinkwasser des WWR&U wurde in den Jahren 2020 bis 2022 in nationalen und kantonalen Versuchsreihen erstmals auf PFAS-Verbindungen geprüft und als unbedenklich bestätigt. Um die Messreihe fortzusetzen, führt das Wasserwerk seit 2024 jährlich eigene Messungen durch. Im Jahr 2025 wurden dabei PFAS-Verbindungen im Grundwasser in der Reinacher Heide und im Trinkwasser des Reservoirs Froloo, in dem sich eine Mischung von Grundwasser aus der Reinacher Heide und zugeleitetem Trinkwasser der Hardwasser AG befindet, analysiert.

Die Wasserproben entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme in den untersuchten Parametern allesamt den Anforderungen gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV, SR 817.022.11).

Gesetzlich sind drei PFAS-Verbindungen mit einem Höchstwert geregelt. Die Messwerte vom WWR&U unterschreiten diesen Höchstwert (Einlauf / Auslauf Froloo), um das 30- bis 300-fache.

3.3 Trinkwassertemperatur

Die nachfolgende Grafik zeigt den Jahresgang (2017 bis 2025) der Aussentemperatur (Gemeinde Reinach) und denjenigen der Trinkwassertemperatur an verschiedenen Entnahmeorten, im Versorgungsgebiet des Wasserwerks Reinach und Umgebung.

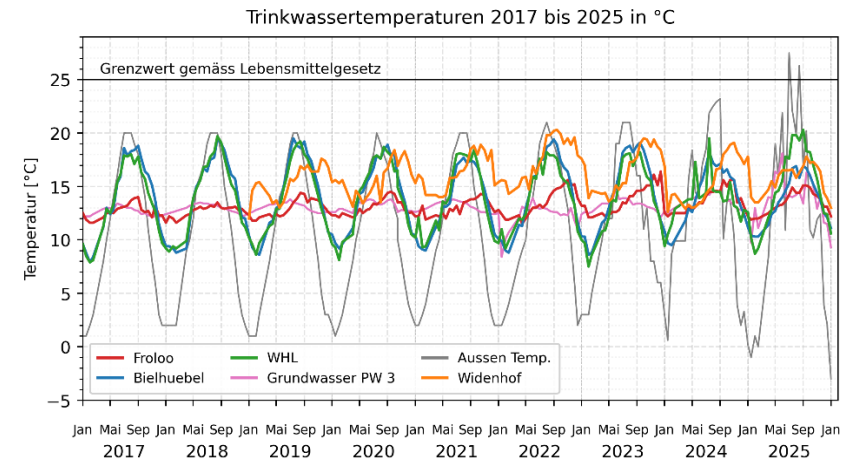

Die Grundwassertemperatur in der Reinacher Heide betrug über das ganze Jahr 10 bis 18°C. Im Netz kann es daraus folgend zu Temperaturen über 20 Grad kommen. Das Trinkwasser im Reservoir Froloo, in der Gemeinde Therwil, variierte im Jahresverlauf 2025 nur 3.2 °C, während die Temperaturdifferenz im Reservoir Bielhübel, in der Gemeinde Oberwil, bei 6.6°C lag. Obwohl die Schwankungsbreite und damit auch die Maximaltemperatur im Reservoir Bielhübel höher als im Reservoir Froloo lag, kann ein positiver Effekt der neuen Verbindungsleitung Froloo-Bielhübel, die im Juni 2024 ans Netz ging, erkannt werden. Denn im Jahr 2023 variierte die Temperatur im Reservoir Bielhübel noch um über 10 °C. Die Temperatur des Trinkwassers, insbesondere im Reservoir Bielhübel, soll in den kommenden Jahren weiter intensiv beobachtet und mit baulichen Massnahmen, wenn möglich weiter reduziert werden (Siehe 5.2.3).

Im langjährigen Mittel (Messungen seit 2006) nimmt die Lufttemperatur jährlich um 0.18°C zu. Das Wasser folgt dieser Entwicklung verlangsamt mit einer jährlichen Zunahme von ca. 0.08°C.

3.4 Grundwasserstände in der Reinacher Heide


Die Niederschlagsmenge war im Berichtsjahr mit insgesamt 930 mm (Daten des Meteorologischen Vereins der Region Basel, Station Basel/Binningen) höher als im Vorjahr (2024: 830 mm). Der langjährige Mittelwert (1999-2024) der Niederschlagsmenge der Station Binningen beträgt 833 mm.

Der Birsabfluss bei der Messstation Hofmatt in Münchenstein lag mit durchschnittlich 14.7 m³/s unter dem Vorjahr (16.5 m³/s).

Durch den erhöhten Hardwasser-Bezug im letzten Quartal 2025 konnten sich die Grundwasserstände in der Reinacher Heide erholen. Zusammen mit einem niederschlagsreichen Herbst konnte eine gute Ausgangslage für das Jahr 2026 geschaffen werden.

4 Versickerungsanlage Aesch

Die kantonale Versickerungsanlage «Kuhweid» in Aesch war das ganze Jahr über in Betrieb. Rund 5,3 Mio.m³ Birswasser wurden im Berichtsjahr über die Kies- und Sandfilterbecken dem Grundwasser zugeführt. Dies entspricht einer kontinuierlichen Versickerungsleistung von 233 l/s.

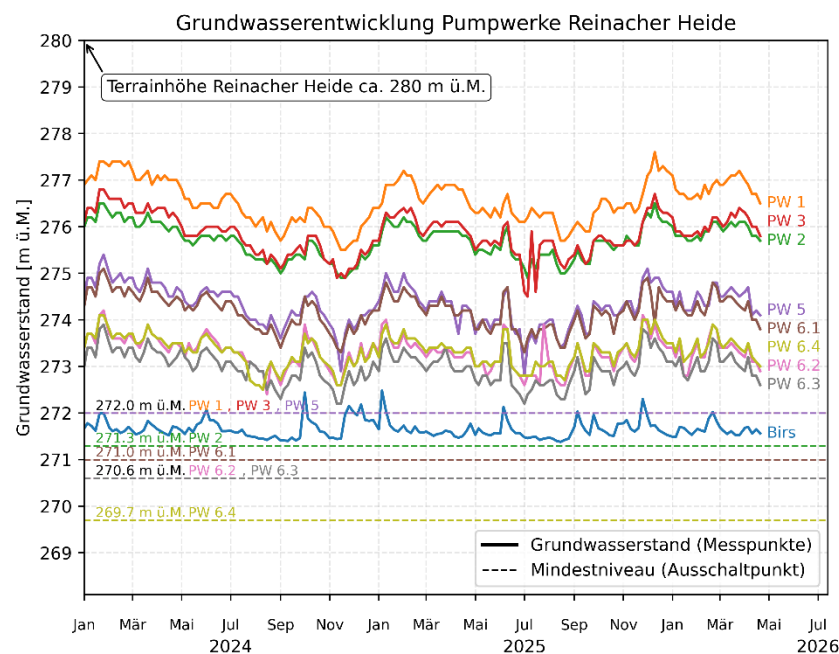

5 Bau und Betrieb

5.1 Wasserleitungsbrüche und Netzverluste

Im WWR&U-Transportleitungsnetz von 61,5 km Länge wurden im Berichtsjahr keine Wasserleitungsbrüche verzeichnet.

Die erfassten Netzverluste im WWR-Versorgungsgebiet beliefen sich, bezogen auf die eigene Grundwasserförderung und den Fremdwasserbezug, auf 8.97% der Jahresmenge (Durchschnitt der letzten 5 Jahre: 7,94%). Gemäss der SVGW-Statistik betragen die mittleren Netzverluste aller schweizerischen Trinkwasserversorgungen rund 12%. Damit kann dem WWR&U-Netz ein ausserordentlich guter Zustand attestiert werden.

5.2 Bauliches

Im Rahmen der Werterhaltung und des Ausbaus der WWR-Infrastrukturen wurden im Berichtsjahr nachfolgende Investitionsvorhaben ausgeführt.

5.2.1 Projektabschluss Verbindungsleitung Reservoir Froloo – Bielhubel

Nach der Inbetriebnahme der neuen Verbindungsleitung vom Reservoir Froloo zum Reservoir Bielhubel im Sommer 2024 erfolgte im Frühjahr 2025 die Genehmigung der Schlussrechnung durch die entsprechenden Gremien.

Bei einem budgetierten Kredit von CHF 1'800'000.00 (exkl. MwSt.) schliesst das Projekt mit Kosten von CHF 1'860'229.00 (exkl. MwSt.) (+3.35%).


5.2.2 Redundanz Reichensteinerstrasse-Dornacherweg, Reinach

Im Zuge des Fernwärmenetzausbaus in Reinach wurde eine neue redundante Leitung erstellt. Die neue Leitung HDPE DN 450/400 im


Bereich Dornacherweg sowie die Querung der Tramlinie in Höhe Baselstrasse konnte, zusammen mit der Trinkwasserleitung der Gemeinde Reinach, im Herbst 2024 realisiert werden. Die Inbetriebnahme der neuen Leitungen erfolgte im Mai 2025. Abgeschlossen wurden die Arbeiten im Bereich Reichensteinerstrasse mit der Instandstellung des Deckbelags im Oktober 2025.

5.2.3 Relining Sägestrasse / Mühlestrasse Oberwil

Die Inbetriebnahme der neuen Verbindungsleitung Froloo-Bielhubel im Sommer 2024 erlaubte eine Erneuerung der parallel dazu verlaufenden Hauptleitung in der Sägestrasse/Mühlestrasse in Oberwil im Relining-Verfahren. Der Querschnitt dieses Leitungsstrangs wurde dabei durch den Einzug einer PE DN180 (Di=147.2) in das bestehende Gussrohr DN350 verkleinert. Während die Wasser- und Löschversorgung im Quartier weiterhin gewährleistet ist, wird dadurch auf Netzebene die Direktverbindung Froloo - Bielhubel zur Befüllung des Letzteren bevorzugt, was sich positiv auf die Wasserqualität (Temperatur) auswirkt.

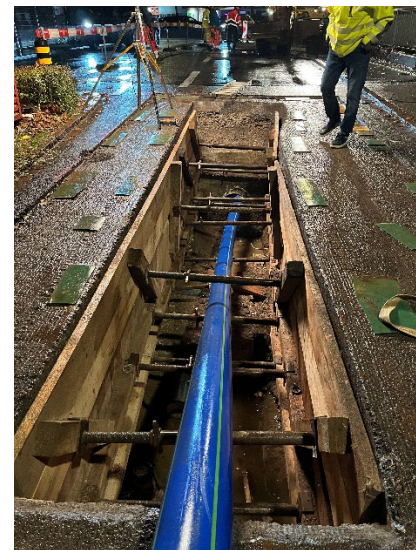


Einzug PE-DN180 in die Birsigbrücke

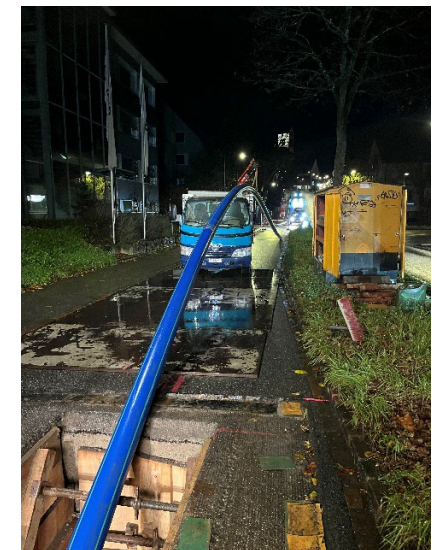

Einseitige nächtliche Sperrung der Mühlestrasse Oberwil

5.2.4 Bruderholzstrasse Oberwil

Der Leitungsersatz in der Therwiler- (50m) und Bruderholzstrasse (400m), in Oberwil, startete im Juni 2025 und dauert noch bis voraussichtlich Ende 2026. Die vorhandene Gussleitung wird durch eine PE DN315 (Di=257.8mm), mehrheitlich im offenen Graben, ersetzt. Die Linienführung ist stellenweise anzupassen, da diese heute durch diverse private Parzellen führt. An einigen Stellen wird das Trinkwassernetz der Gemeinde Oberwil eingebunden, um dadurch künftig Hausanschlüsse direkt auf die WWR&U Hauptleitung zu verhindern.

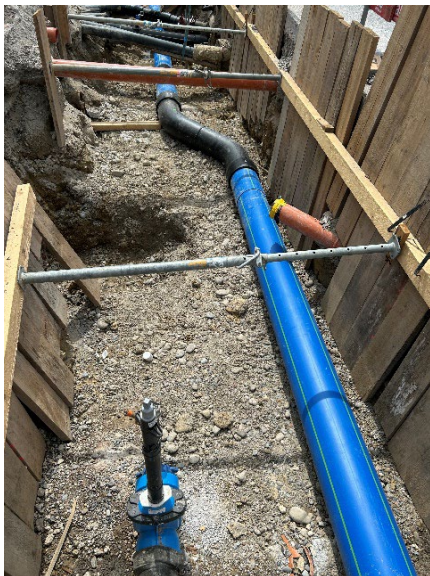

Leitung im Graben mit Querversatz



Druckprobe eine Teilstrangs


5.2.5 Ersatz Hauptleitung Talholzstrasse, Bottmingen

Im Berichtsjahr 2025 wurde die Erneuerung der WWR&U-Hauptleitung in der Talholzstrasse in Bottmingen projektiert und die Hauptgewerke vergeben. Im Abschnitt Therwilerstrasse bis zur Kreuzung Eugstler-/Breitackerweg (Gesamtlänge ca. 950m), wird die bestehende Grauguss-Leitung (von 1938) durch eine Kunststoffleitung in Polyethylen, Druckstufe 16bar und einem Aussendurchmesser von

250mm ersetzt. Die Linienführung der Leitung wird angepasst und die bisher eingebundenen Hausanschlüsse von der WWR&U Hauptleitung auf die ebenfalls neu erstellte Versorgungsleitung der Gemeinde umgehängt.



Anschlusspunkt Therwilerstrasse

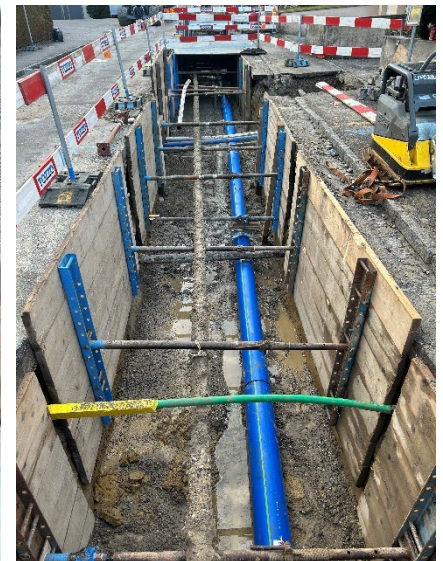

Leitung im Kombigraben verlegt

Das Wasserwerk Reinach und Umgebung wirkt als Initiator im Projekt federführend. Weitere Werke (IWB-Gas, Primeo AG-Strom, inter-GGA-Glasfaser) sowie die Wasserversorgung und Tiefbauabteilung der Gemeinde Bottmingen) beteiligen sich in Koordination. Der Baustart erfolgte am 19. Januar 2026.

5.3 Weitere Themen die den Betrieb beeinflussen

5.3.1 Selbstkontrollkonzept gemäss SVGW Leitlinie W12

Mit der Einführung eines zertifizierten Selbstkontrollkonzepts, gemäss der aktuellen SVGW-Richtlinie «Leitlinie für eine gute Verfahrenspraxis» (W12), wird das bisherige Qualitätsmanagementsystem «WQS SVGW» abgelöst.

Die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines Projekts unter der externen Leitung von Simona Breu von der Hardwasser AG. In einem ersten Schritt wurde durch Fachleute (Brunnenmeister, Werksingenieur, Werksleitung) beim WWR&U eine systematische und umfangreiche Bestandesaufnahme vorgenommen. Dies betrifft nebst organisatorischen Aspekten auch die Primäranlagen des Wasserwerks (Grundwasser- und Stufenpumpwerke, Reservoir, Versorgungsleitungen) sowie die Infrastrukturen der angeschlossenen Gemeinden (Verteilnetze, Hausanschlüsse, Schachtbauwerke etc.). In einem zweiten Schritt wurde für alle Prüfpunkte eine Risikobewertung vorgenommen und daraus, wenn notwendig, eine Massnahmenplanung erarbeitet. Die künstliche Anreicherung des Grundwassers gehört, als vorgelagerter Prozessschritt, ebenfalls zum Gesamtprozess des Trinkwassers. Deshalb wurde die Bestandesaufnahme und Risikobetrachtung für die Versickerungsanlage Aesch ebenfalls durchgeführt, dies gemeinsam mit den Verantwortlichen des Zweckverband Aesch, Dornach, Pfeffingen.

Insgesamt wurden 920 Leitlinienpunkte überprüft, wobei 87% "voll" oder "teilweise" erfüllt waren. In Abhängigkeit des eingeschätzten Risikos wurden Massnahmen definiert und priorisiert. Vier Massnahmen mit höchster Priorität wurden bereits als «Sofortmassnahmen» umgesetzt.

Weitere rund 190 Massnahmen müssen in den kommenden 2-10 Jahre (je nach Priorität) umgesetzt werden, viele davon im Rahmen von Sanierungsprojekten (z.B. Verbesserung von Be- und Entlüftungsarmaturen oder diverse Schachtzustiege), einige betreffen auch

organisatorische Punkten (z.B. fehlende Aktualisierung von Organigrammen).

Als letzter Schritt des Projekts erfolgt im Jahr 2026 der Aufbau einer «papierlosen» Dokumentation auf einem Sharepoint – Server, zum einfacheren Zugang und Management der QM – Dokumentation. Im Anschluss daran soll mit der angestrebten SVGW – Zertifizierung der Nachweis erbracht werden, dass sämtliche Prozesse rund um das Trinkwasser des WWR&U konform zur Gesetzgebung (z.B. Lebensmittelrecht) sind.



Brunnenmeister Daniel Gutzwiller und Werksingenieur Martin Indermitte kontrollieren im Rahmen der Bestandesaufnahme einen Messschacht.

5.3.2 Digitalisierung, Einführung Instandhaltungssoftware


Gesetzliche Anforderungen, welche im Zusammenhang mit der Abgabe des Lebensmittels Trinkwasser gelten, sind stetig am Steigen.

Im Vordergrund steht die Pflicht einer nachvollziehbaren und lückenlosen Dokumentation aller Arbeiten, welche an den Infrastrukturen der Wasserversorgung getätigt werden. Dies kann am besten mit Hilfe digitaler Mittel umgesetzt werden. Mit dem zusätzlichen Wunsch nach effizienter und moderner Arbeitsweise (z.B. Einsatz von mobilen Geräten), wurde das Projekt „Wasser 4.0@WWR“ gestartet. Als wichtigster Teil dieses Projekts wird eine Instandhaltungssoftware eingeführt, welche die Nutzung umfangreicher Funktionen wie Anlagendatenbank, Meldungs- und Auftragsmanagement, Checklisten, etc. ermöglicht.

Im Jahr 2025 konnten sämtliche Anlagen des Wasserwerks (Grundwasserbrunnen, Pumpstationen, Transportleitungen mit Armaturen, Reservoirs) erfasst werden. Somit sind alle wichtigen Informationen für diese Infrastrukturen (z.B. Anlagenstatus, Störungen, Arbeitsaufträgen, Anlageninformationen, etc.) jederzeit über Desktop-PC oder über mobile Geräte digital verfügbar. Die Mitarbeitenden wurden in das Projekt einbezogen und geschult, die Resonanz ist nach den ersten praktischen Erfahrungen positiv.

Auch die Infrastrukturen der angeschlossenen Gemeinden (Leitungsnetze, Armaturen, Hydranten, Öffentliche Brunnen, etc.) sind Teil des Projekts. Die involvierten externen Brunnenmeister oder externe Firmen (z.B. für Hydranten-Kontrollen) wurden ebenfalls in die Umsetzung einbezogen. Der Umsetzungsstand bei den Gemeinden umfasst ca. 50% und wird im Jahr 2026 abgeschlossen.

Die Arbeitsweise mit der Instandhaltungssoftware bildet auch eine wichtige Grundlage für den angestrebten einheitlichen Qualitätsstandard im WWR&U, insbesondere um diesen nachhaltig zu sichern.

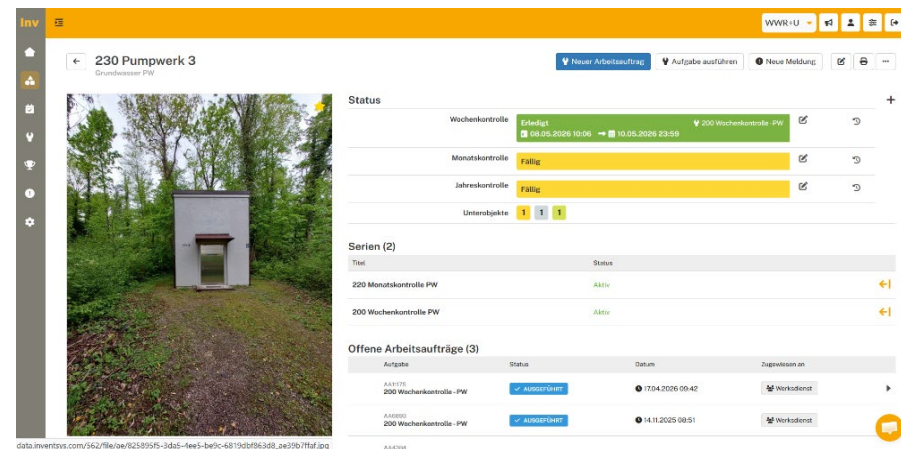

Ansicht Pumpwerk 3: Alle wichtigen Informationen der Infrastrukturen sind auf einen Blick strukturiert und nachvollziehbar ersichtlich (z.B. Anlagenstatus, Störungen, Arbeitsaufträgen, Anlageninformationen, etc.).

Als weiteres wichtiges Element wird in diesem Projekt im Jahr 2026 auch eine einheitliche GIS – Plattform für alle WWR-Leitungsdaten eingerichtet, welche als Datengrundlage dann wiederum in Invenio angezeigt werden kann.

6 Jahresrechnung

Die Erfolgsrechnung 2025 schliesst mit einem Jahresaufwand von CHF 3'824'494.15 und einem Jahresertrag von CHF 3'920'933.55 ab. Davon machen Entschädigungen an das Gemeinwesen CHF 1'117'278.40 (29%), der Sach- und Betriebsaufwand CHF 854'895.35 (22%), Abschreibungen Verwaltungsvermögen CHF 354'647.50 (9%), der Personalaufwand CHF 97'672.90 (3%) aus. Mit der Erfolgsrechnung wurden CHF 1'400'000 (37%) als Einlage in die Vorfinanzierung künftiger Projekte eingestellt. Die Investitionsrechnung weist mit CHF 1'255'559.06, gegenüber dem Vorjahr (CHF 1'599'625.25), einen geringeren Aufwand aus. Die Höhe ist hier massgeblich durch den Projektfortschritt beeinflusst und kann von Jahr zu Jahr variieren.

Die Bilanz per 31. Dezember 2025 umfasst Aktiven von CHF 19'117'420.45 (Vorjahr: CHF 17'974'703.62). In Anbetracht der in den kommenden Jahren anstehenden Projekte gilt der Liquidität künftig ein besonderes Augenmerk.

6 Konsumierende und Gemeindeentgelte

Gemeinde	Anzahl Trinkwasserbezüger	Total Zahlungen 2025 (excl. MwSt.)	Anteil in %
Biel - Benken	3'570	214'200	6.04
Bottmingen	7'047	422'820	11.92
Ettingen	5'660	339'600	9.57
Oberwil	11'539	692'340	19.52
Reinach	21'109	1'266'540	35.70
Therwil	10'200	612'000	17.25
Total	59'125	3'547'500	100.00

Die Entgelte der Gemeinden werden jeweils mit einer Ausgleichszahlung in der folgenden Rechnungsperiode ausgeglichen.

7 Ausblick

Im Jahr 2026 steht die Umsetzung einiger grösser Projekte an. So beträgt die budgetierte Investitionssumme CHF 1,92 Mio. Zudem wird eine Mehrjahresprojektplanung erarbeitet sowie aus dem Qualitätsmanagementsystem «W12» die Massnahmenumsetzungsplanung. Beides wird in eine Mehrjahresfinanzplanung einfließen und so den Finanzbedarf der kommenden Jahre aufzeigen.

8 Dank

Der grosse Dank geht in diesem Jahr wiederum an die Trägergemeinden des WWR&U, die unser Wasser dem Bedarf entsprechend

durch Ihre Gemeindenetze leiten und in bester Qualität den Konsumierenden in die Liegenschaften liefern.

Ebenso ein grosser Dank gilt den Mitarbeitenden der Gemeinde Reinach für ihren tagtäglichen Einsatz zugunsten des Wasserwerks und der Versickerungsanlage Aesch.

Und der letzte Dank geht an die Mitglieder in den verschiedenen Gremien für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Arbeit und die bereichernde Zusammenarbeit.

Wasserwerk Reinach und Umgebung



Hanspeter Ryser
Präsident



Thomas Meier
Werkleiter

Reinach, im Mai 2026



2025 Rechnung

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen
 Rechnung / 26.3.2026 1.1.2025 - 31.12.2025 RE ER Funkt 6stellig
 Wasserwerk Reinach und Umgebung

Nummer Bezeichnung		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	3'824'494.15	3'920'933.55	2'941'500	3'889'000	3'713'652.64	3'942'996.77
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>96'439.40</i>		<i>947'500</i>		<i>229'344.13</i>	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'824'494.15	3'920'933.55	2'941'500	3'889'000	3'713'652.64	3'942'996.77
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>96'439.40</i>		<i>947'500</i>		<i>229'344.13</i>	
71	Wasserversorgung	3'824'494.15	3'920'933.55	2'941'500	3'889'000	3'713'652.64	3'942'996.77
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>96'439.40</i>		<i>947'500</i>		<i>229'344.13</i>	
710	Wasserversorgung	3'824'494.15	3'920'933.55	2'941'500	3'889'000	3'713'652.64	3'942'996.77
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>96'439.40</i>		<i>947'500</i>		<i>229'344.13</i>	
7101	Wasserversorgung (SF)	3'824'494.15	3'920'933.55	2'941'500	3'889'000	3'713'652.64	3'942'996.77
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>96'439.40</i>		<i>947'500</i>		<i>229'344.13</i>	
3000.01	Behörden und Kommissionen Fixum	31'000.00		31'000		31'000.00	
3000.02	Behörden und Kommissionen Sitzungsgelder	23'100.00		25'000		28'350.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'760.90		13'000		12'641.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'775.35		3'500		2'812.40	
3053.01	Unfallversicherungen	112.25		500		102.90	
3099.01	Sonstiger Personalaufwand	27'924.40		30'000		15'791.07	
3100.01	Büromaterial			1'000		173.00	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	6'315.00		1'500		924.00	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz.	469.45		2'000			
3118.01	Immaterielle Anlagen Software/Lizenzen	21'123.35		30'000		27'501.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung	429'345.75		600'000		336'003.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'602.55		35'000		45'047.98	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Mitgliederbeiträge	24'596.00		25'000		24'625.44	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten / Werkingenieur	97'953.65		85'000		93'442.25	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten / Leitungskataster	22'787.95		20'000		1'435.90	
3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten / Trinkwasseruntersuchungen	9'173.40		9'000		8'523.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 26.3.2026 1.1.2025 - 31.12.2025 RE ER Funkt 6stellig
Wasserwerk Reinach und Umgebung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.04	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten / Mutationen Netzinfr.system					11'757.90	
3132.05	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten / Wasserqualitätssystem SVGW	14'500.75		10'000		30'331.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	28'536.25		28'000		28'078.15	
3140.01	Unterhalt an Grundstücken Froloo/Weiher	7'000.00		6'000		6'975.15	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	87'631.20		160'000		133'521.85	
3144.01	Unterhalt Hochbauten	15'962.25		25'000		548.90	
3151.01	Unterhalt App., Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	21'739.25		75'000		33'234.50	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)			10'000			
3170.01	Reisekosten und Spesen	493.00		5'000		1'821.95	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand 50jähriges Jubiläum	61'665.55		50'000			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	354'647.50		354'000		316'721.15	
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten					1'733.95	
3611.01	Entschädigungen an Kanton / Grundwasser - und Nutz.gebühr/VA Aesch	121'852.40		140'000		171'415.65	
3611.02	Entschädigungen an Kanton / Trinkwasserkontrollen	22'154.75		28'000		21'956.00	
3612.01	Entsch. an Gemeinde Reinach Verwaltungskosten	240'833.25		250'000		259'818.70	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / Hardwasser AG / Trinkwasserbezug	568'770.75		720'000		701'770.85	
3614.02	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen / IWB AG	25'667.25		28'000		27'591.65	
3614.03	Entschädigung an öffentliche Unternehmungen/Hardwasser AG und IWB/Dienstleistungen	138'000.00		140'000		138'000.00	
3893.04	Einlagen in Vorfinanzierung / WL Talholzstr./Bottmingen	400'000.00				400'000.00	
3893.06	Einlagen in Vorfinanzierung / WL Dornacherweg-Thiersteinerstr./Reinach					400'000.00	
3893.07	Einlagen in Vorfinanzierung / WL Bruderholzstr.-Bottmingerstr./Oberwil	200'000.00				400'000.00	
3893.08	Einlagen in Vorfinanzierung / WL Relining Sägestr./Oberwil	300'000.00					
3893.09	Einlagen in Vorfinanzierung / WL Ersatz Froloo-Hagendörnli/Oberwil	400'000.00					
3893.15	Einlagen in Vorfinanzierung / Mobile Trinkwasser-Aufbereitungsanlage	100'000.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung / 26.3.2026 1.1.2025 - 31.12.2025 RE ER Funkt 6stellig
Wasserwerk Reinach und Umgebung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen u. Kostenbeteiligungen Dritter		462.70				558.15
4390.01	Übriger Ertrag/WHL AG Beitrag an alte Investitionen		22'487.00		27'000		29'487.00
4400.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'800.08				2'800.05
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'543.20		8'000		8'566.45
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und ZV / Wasserbezug über PW Kägen		39'508.35		10'000		51'087.05
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und ZV / Wasserbezug		7'416.50		12'000		9'400.30
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und ZV / Unterhalt Widen		5'503.90		7'000		6'326.65
4614.01	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen / WHL AG		98'773.05		100'000		98'505.05
4632.01	Beiträge von Gemeinden und ZV Betriebskosten		3'533'560.00		3'524'000		3'557'040.00
4699.01	Einnahmen aus CO2-Rückverteilungen		25.80				50.25
4840.01	Ausserordentliche Finanzerträge						12'390.00
4893.01	Entnahmen aus Vorfinanzierungen / Redundanz TL Birstal		161'131.50		161'000		161'131.50
4893.02	Entnahmen aus Vorfinanzierungen / Redundanz WL Therwil nach Ettingen		5'654.32		5'000		5'654.32
4893.03	Entnahmen aus Vorfinanzierungen / WL Reservoir Froloo-Bielhübel		35'067.15		35'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Rechnung / 24.2.2026 1.1.2025 - 31.12.2025 RE IR VV Funkt 6stellig
Wasserwerk Reinach und Umgebung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'255'559.06		1'210'000		60'600.00	1'599'625.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'255'559.06</i>		<i>1'210'000</i>	<i>1'539'025.25</i>	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'255'559.06		1'210'000		60'600.00	1'599'625.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'255'559.06</i>		<i>1'210'000</i>	<i>1'539'025.25</i>	
71	Wasserversorgung	1'255'559.06		1'210'000		60'600.00	1'599'625.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'255'559.06</i>		<i>1'210'000</i>	<i>1'539'025.25</i>	
710	Wasserversorgung	1'255'559.06		1'210'000		60'600.00	1'599'625.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'255'559.06</i>		<i>1'210'000</i>	<i>1'539'025.25</i>	
7101	Wasserversorgung (SF)	1'255'559.06		1'210'000		60'600.00	1'599'625.25
7101.5020.001	Birsuferschutz Reinacherheide/Reinach						14'014.85
7101.5020.002	Birsuferschutz Reinacherheide/Reinach 2. Teil	8'695.55					
7101.5030.026	Leitung Reservoir Froloo/Bielhübel						1'320'309.90
7101.5030.030	Leitungsbau Talholzstr./Bottmingen	257'637.00		400'000			99'014.55
7101.5030.032	Leitungsbau Bruderholzstr.-Bottmingerstr./Oberwil	402'560.55					13'098.90
7101.5030.036	Leitungsbau Buechloch/Reinach	23'484.00		300'000			23'734.00
7101.5030.037	Leitungsbau Relining Sägestr./Oberwil	106'298.05		50'000			
7101.5030.038	Leitungsbau	352'034.60					129'453.05
	Dornacherweg_Reichensteinerstr._Thiersteinerstr./Reinach						
7101.5030.040	Leitungsbau Ersatz Maienweg/Reinach			100'000			
7101.5040.001	Erneuerung PW Untere Wanne/Münchenstein	3'939.56		100'000			
7101.5040.002	Umbau,Abbruch Trafo-Gebäude PW 3/Reinach			50'000			
7101.5200.001	Leitsystem und Steuerung Erneuerung	49'571.25		100'000			
7101.5200.002	Datenspeicherung (Historie)			50'000			
7101.5200.003	Qualitätssicherung Infrastruktur	41'835.10		30'000			
7101.5200.004	Grundwasserüberwachung	9'503.40		30'000			
7101.6350.001	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen Schadenfall					60'600.00	

Bilanz

Rechnung / 15.03.2017 1.1.2025 - 31.12.2025

Wasserwerk Reinach und Umgebung

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
	Aktiven	17'974'703.62	9'958'266.99	8'815'550.16	19'117'420.45
10	Finanzvermögen	2'114'580.27	8'702'707.93	8'460'902.66	2'356'385.54
1002	Bank	1'289'267.80	4'512'470.38	3'711'919.78	2'089'818.40
10020	Bank	1'289'267.80	4'512'470.38	3'711'919.78	2'089'818.40
10020.01	BL Kantonalbank Arlesheim KK	1'271'778.70	4'512'470.38	3'711'847.78	2'072'401.30
10020.03	Raiffeisenbank Leimental	17'489.10		72.00	17'417.10
1010	Forderungen aus Lief./Leist. gegenüber Dritten	608'872.00	3'828'638.60	4'388'385.70	49'124.90
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	607'892.00	3'828'638.60	4'388'385.70	48'144.90
10100.01	übrige Debitoren	607'892.00	3'828'638.60	4'388'385.70	48'144.90
10102	Forderungen Verrechnungssteuer	980.00			980.00
10102.01	Forderungen Verrechnungssteuer	980.00			980.00
1019	Übrige Forderungen	75'729.57	228'533.35	219'886.28	84'376.64
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	75'729.57	228'533.35	219'886.28	84'376.64
10192.00	MWST-Abrechnungskonto	75'729.57	228'793.90	220'146.83	84'376.64
10192.01	MWST-Vorsteuerguthaben ER		-260.55	-260.55	
1045	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	140'710.90	133'065.60	140'710.90	133'065.60
10450	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen	140'710.90	133'065.60	140'710.90	133'065.60
10450.01	Übrige aktive Rechnungsabgrenzung	140'710.90	133'065.60	140'710.90	133'065.60
14	Verwaltungsvermögen	15'860'123.35	1'255'559.06	354'647.50	16'761'034.91
1402	Wasserbau	28'869.60	8'695.55	721.75	36'843.40
14020	Wasserbau	28'869.60	8'695.55	721.75	36'843.40
14020.01	Wasserbau	28'869.60	8'695.55	721.75	36'843.40

Bilanz

Rechnung / 15.03.2017 1.1.2025 - 31.12.2025

Wasserwerk Reinach und Umgebung

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
1403	Übrige Tiefbauten	15'763'882.76	1'142'014.20	343'001.15	16'562'895.81
14031	Wasserversorgung	15'763'882.76	1'142'014.20	343'001.15	16'562'895.81
14031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	15'763'882.76	1'142'014.20	343'001.15	16'562'895.81
1404	Hochbauten		3'939.56		3'939.56
14041	Wasserversorgung		3'939.56		3'939.56
14041.01	Hochbauten Wasserversorgung		3'939.56		3'939.56
1406	Mobilien	67'369.99		10'924.60	56'445.39
14061	Wasserversorgung	67'369.99		10'924.60	56'445.39
14061.01	Mobilien Wasserversorgung	67'369.99		10'924.60	56'445.39
1420	Software		100'909.75		100'909.75
14201	Wasserversorgung		100'909.75		100'909.75
14201.01	Wasserbau		100'909.75		100'909.75
1454	Beteilig.an öffentl.Unternehmungen	1.00			1.00
14541	Wasserversorgung	1.00			1.00
14541.01	Hardwasser AG Aktien	1.00			1.00

Bilanz

Rechnung / 15.03.2017 1.1.2025 - 31.12.2025

Wasserwerk Reinach und Umgebung

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
	Passiven	17'974'703.62	5'749'591.80	4'606'874.97	19'117'420.45
20	Fremdkapital	1'445'308.90	3'853'152.40	4'005'022.00	1'293'439.30
2000	Kreditoren	1'140'926.65	3'442'553.35	3'650'390.35	933'089.65
20000	Kreditoren	1'140'926.65	3'442'553.35	3'650'390.35	933'089.65
20000.01	Kreditoren Sammelkonto	1'140'926.65	3'442'553.35	3'650'390.35	933'089.65
2001	Kontokorrente mit Dritten	-200.15	4'703.85	5'474.70	-971.00
20010	Kontokorrente mit Dritten	-200.15	4'703.85	5'474.70	-971.00
20010.01	Kontokorrent mit Dritte AHV	-200.15	4'619.85	5'474.70	-1'055.00
20010.02	KK mit Dritten Unfallversicherung		84.00		84.00
2002	Steuern		31.85	31.85	
20022	Steuerschulden MWST		31.85	31.85	
20022.11	Umsatzsteuer		31.85	31.85	
2005	Durchlaufskonto		44'542.70	44'542.70	
20050	Durchlaufskonto		44'542.70	44'542.70	
20050.01	Gehälter, Vorschüsse		44'542.70	44'542.70	
2045	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	304'582.40	361'320.65	304'582.40	361'320.65
20450	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen	304'582.40	361'320.65	304'582.40	361'320.65
20450.01	Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	304'582.40	361'320.65	304'582.40	361'320.65
29	Eigenkapital	16'529'394.72	1'896'439.40	601'852.97	17'823'981.15
2930	Vorfinanzierungen für noch nicht real. Projekte	1'800'000.00	1'400'000.00	400'000.00	2'800'000.00
29301	Wasserversorgung	1'800'000.00	1'400'000.00	400'000.00	2'800'000.00
29301.04	Wasserwerk Vorfinanzierung WL Talholzstr./Bottmingen	400'000.00	400'000.00		800'000.00

Bilanz

Rechnung / 15.03.2017 1.1.2025 - 31.12.2025

Wasserwerk Reinach und Umgebung

Nummer	Bilanz	01.01.2025	Zuwachs	Abgang	31.12.2025
29301.05	Wasserwerk Vorfinanzierung WL Buechloch/Reinach	600'000.00			600'000.00
29301.06	Wasserwerk WL Dornachweg-Thiersteinerstr./Reinach	400'000.00		400'000.00	
29301.07	Wasserwerk WL Bruderholzstr.-Bottmingerstr./Oberwil	400'000.00	200'000.00		600'000.00
29301.08	Wasserwerk WL Relining Sägestr./Oberwil		300'000.00		300'000.00
29301.09	Wasserwerk WL Ersatz Froloo-Hagendörnli/Oberwil		400'000.00		400'000.00
29301.15	Wasserwerk WL Mobile Trinkwasser-Aufbereitungsanlage		100'000.00		100'000.00
2931	Vorfinanzierungen für bereits real. Investitionen	9'114'550.69	400'000.00	201'852.97	9'312'697.72
29311	Wasserversorgung	9'114'550.69	400'000.00	201'852.97	9'312'697.72
29311.01	Wasserwerk Redundanz TL Birstal	7'089'786.01		161'131.50	6'928'654.51
29311.02	Wasserwerk Redundanz WL Therwil-Ettingen	271'407.36		5'654.32	265'753.04
29311.03	Wasserwerk WL Res. Froloo-Bielhübel	1'753'357.32		35'067.15	1'718'290.17
29311.06	Wasserwerk WL Dornacherweg-Thiersteinerstr./Reinach		400'000.00		400'000.00
2999	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'614'844.03	96'439.40		5'711'283.43
29990	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'614'844.03	96'439.40		5'711'283.43
29990.01	Eigenkapital	5'614'844.03	96'439.40		5'711'283.43

Wasserwerk Reinach & Umgebung				Auflistung der Investitionen Rechnung 2025					
Konto	Bezeichnung	Beschluss		Kredit	Kumulierte Ausgaben bis	Verbleibender Kredit ohne Ausgaben	Ausgaben 2025	Verbleibender Kredit per	Schluss-abrechnung
		Datum	Art		31.12.24	im 2025	31.12.2025	31.12.25	
	TOTAL			2'870'000.00	265'300.50	2'604'699.50	1'255'559.06	1'349'140.44	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			2'870'000.00	265'300.50	2'604'699.50	1'255'559.06	1'349'140.44	
7101.5020.002	Birsuferschutz Reinacherheide/Reinach 2. Teil	25.10.2023	BU	50'000.00		50'000.00	8'695.55	41'304.45	offen
7101.5030.030	Leitungsbau Talholzstr./Bottmingen	29.10.2021	BU	200'000.00	99'014.55	100'985.45	100'985.45		offen
		25.10.2023	BU	50'000.00		50'000.00	50'000.00		
		23.10.2024	BU	400'000.00		400'000.00	106'651.55	293'348.45	
7101.5030.032	Leitungsbau Bruderholzstr.-Bottmingerstr./Oberwil	29.10.2021	BU	200'000.00	13'098.90	186'901.10	186'901.10		offen
		25.10.2023	BU	200'000.00		200'000.00	215'659.45	-15'659.45	
7101.5030.036	Leitungsbau Buechloch/Reinach	25.10.2023	BU	100'000.00	23'734.00	76'266.00	23'484.00	52'782.00	offen
		23.10.2024	BU	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
7101.5030.037	Leitungsbau Relining Sägestr./Oberwil	23.10.2024	BU	50'000.00		50'000.00	50'000.00		offen
		05.02.2025	NT	300'000.00		300'000.00	56'298.05	243'701.95	
7101.5030.038	Leitungsbau Dornacherweg-Reichensteinerstr.-Thiersteinerstr./Reinach	29.05.2024	NT	560'000.00	129'453.05	430'546.95	352'034.60	78'512.35	abgeschlossen
7101.5030.040	Leitungsbau Ersatz Maienweg/Reinach	23.10.2024	BU	100'000.00		100'000.00		100'000.00	offen
7101.5040.001	Erneuerung PW Untere Wanne/Münchenstein	23.10.2024	BU	100'000.00		100'000.00	3'939.56	96'060.44	abgeschlossen
7101.5040.002	Umbau,Abbruch Trafo-Gebäude PW 3/Reinach	23.10.2024	BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	offen
7101.5200.001	Leitsystem und Steuerung Erneuerung	23.10.2024	BU	100'000.00		100'000.00	49'571.25	50'428.75	offen
7101.5200.002	Datenspeicherung (Historie)	23.10.2024	BU	50'000.00		50'000.00		50'000.00	offen
7101.5200.003	Qualitätssicherung Infrastruktur	23.10.2024	BU	30'000.00		30'000.00	41'835.10	-11'835.10	offen
7101.5200.004	Grundwasserüberwachung	23.10.2024	BU	30'000.00		30'000.00	9'503.40	20'496.60	offen



2025 Werkstatistik

2025	Wasserbezüge der WWR Gemeinden													Wasserbezüge Dritter							Eigenbezug WWR			Total
Monat	Reinach [m³] [%]		Oberwil [m³] [%]		Therwil [m³] [%]		Biel-Benken [m³] [%]		Bottmingen [m³] [%]		Ettingen [m³] [%]		Total [m³]	WHL [m3]	ZV A/D/P Kägen [m3]	Arlesheim Widenhof [m3]	IWB Pleuger [m3]	IWB Drissel [m3]	IWB Widenhof [m3]	Total [m³]	Reservoir [m³]	Korrektur [m³]	Total [m³]	[m³]
Januar	112'404	36.4	60'176	19.5	52'836	17.1	20'523	6.6	35'326	11.4	27'956	9.0	309'221	9'713	483	144	0	0	80	10'420	-3'296	0	-3'296	316'345
Februar	99'321	35.1	55'340	19.6	47'502	16.8	19'076	6.7	35'241	12.5	26'198	9.3	282'678	6'897	476	87	10	17	76	7'563	-1'428	0	-1'428	288'813
März	109'663	35.5	62'143	20.1	53'146	17.2	20'452	6.6	36'084	11.7	27'727	9.0	309'215	6'963	11'695	89	0	0	96	18'843	6'575	0	6'575	334'633
April	117'978	34.5	67'518	19.7	56'986	16.6	24'176	7.1	46'921	13.7	28'762	8.4	342'341	9'196	653	116	10	1	64	10'040	-444	0	-444	351'937
Mai	123'279	33.0	74'225	19.9	64'063	17.1	27'366	7.3	53'954	14.4	30'729	8.2	373'616	8'727	534	88	0	1'388	84	10'821	-32	0	-32	384'405
Juni	137'420	32.1	85'542	20.0	73'234	17.1	35'788	8.4	60'256	14.1	35'703	8.3	427'943	21'053	514	114	40	956	98	22'775	1'259	0	1'259	451'977
Juli	126'819	31.6	80'667	20.1	66'242	16.5	33'725	8.4	58'149	14.5	35'769	8.9	401'371	16'135	642	114	80	27	82	17'080	-6'159	0	-6'159	412'292
August	134'799	31.9	85'389	20.2	70'356	16.7	32'300	7.6	62'755	14.9	36'826	8.7	422'425	29'699	2'027	116	130	32	71	32'075	3'633	0	3'633	458'133
September	106'721	33.6	64'395	20.3	52'585	16.6	21'906	6.9	42'389	13.3	29'537	9.3	317'533	19'651	30'128	117	10	106	102	50'114	-948	0	-948	366'699
Oktober	108'748	34.7	64'351	20.5	52'982	16.9	21'284	6.8	38'524	12.3	27'906	8.9	313'795	9'618	70'132	142	0	0	117	80'009	-8'595	0	-8'595	385'209
November	105'795	35.0	60'400	20.0	52'300	17.3	20'235	6.7	36'483	12.1	26'640	8.8	301'853	12'750	18'067	116	50	21	66	31'070	10'177	0	10'177	343'100
Dezember	105'134	35.1	58'291	19.4	52'692	17.6	21'302	7.1	35'074	11.7	27'213	9.1	299'706	4'640	548	115	0	0	84	5'387	-4'849	0	-4'903	300'190
Total Jahr	1'388'081	34.0	818'437	19.9	694'924	17.0	298'133	7.2	541'156	13.0	360'966	8.8	4'101'697	155'042	135'899	1'358	330	2'548	1'020	296'197	-4'107	0	-4'161	4'393'733

Statistik:

2024		1'342'016	34.5	815'770	20.8	655'902	16.8	278'349	7.1	496'049	12.6	322'765	8.3	3'910'851	147'042	150'115	1'449	90	2'981	931	302'608	-11'238	0	-11'859	4'201'600
2023		1'387'408	33.6	859'361	20.8	689'995	16.7	320'468	7.8	528'851	12.8	344'407	8.3	4'130'490	252'715	186'819	1'619	343	311	916	442'723	-1'167	0	-2'488	4'570'725
2022		1'398'228	33.4	836'864	20.0	716'718	17.1	320'054	7.6	546'301	13.0	370'710	8.8	4'188'875	311'175	53'438	1'267	1'899	1'539	868	370'186	3'258	4'632	7'890	4'566'951
2021		1'419'753	34.6	841'609	20.5	693'143	16.9	286'220	7.0	515'285	12.6	348'296	8.5	4'104'306	230'773	8'093	1'242	1'704	491	31'013	273'316	-1'208	0	-1'208	4'376'414
2020		1'567'894	34.5	896'115	19.7	774'611	17.0	343'336	7.6	583'720	12.8	377'688	8.3	4'543'364	363'959	50'801	1'202	362	882	2'620	419'826	-2'140	0	-2'140	4'961'050
2019		1'470'065	35.2	835'917	20.0	708'007	16.9	299'989	7.2	529'450	12.7	337'022	8.1	4'180'450	363'273	42'680	0	0	5'673	2'840	414'466	-2'693	4'000	1'307	4'596'223
2018		1'474'980	34.2	890'000	20.6	733'366	17.0	314'432	7.3	555'723	12.9	344'579	8.0	4'313'081	290'832	44'166	-	475	512	-	335'985	1'622	2'230	3'852	4'652'918
2017		1'416'684	33.6	885'372	21.0	710'844	16.9	316'976	7.5	549'831	13.0	333'612	7.9	4'213'319	273'452	15'328	-	10	103	-	288'893	3'180	0	3'180	4'505'392
2016		1'389'513	34.2	814'541	20.1	711'785	17.5	293'506	7.2	509'798	12.6	340'194	8.4	4'059'337	163'794	6'295	-	383	120	-	170'592	1'970	0	1'970	4'231'899
2015		1'446'866	34.2	857'783	20.3	731'795	17.3	306'602	7.2	523'752	12.4	367'254	8.7	4'234'052	231'948	35'123	-	16	0	-	267'087	2'315	0	2'315	4'503'454
2014		1'423'038	35.3	787'425	19.5	719'721	17.9	269'241	6.7	487'767	12.1	342'937	8.5	4'030'129	94'911	6'219	-	863	6	-	101'999	-3'724	0	-3'724	4'128'404
2013		1'480'070	36.1	791'148	19.3	717'107	17.5	266'546	6.5	494'322	12.0	354'890	8.6	4'104'083	79'909	6'720	-	0	322	-	86'951	-2'227	0	-2'227	4'188'807

Grundwasserförderung und Fremdwasserbezug

2025

2025	Reinacherheide Grundwasserpumpwerke 1-3				Reinacherheide Grundwasserpumpwerke 5, 6.1-6.4						Fremdwasserbezug							Total
Monat	PW 1 [m3]	PW 2 [m3]	PW 3 [m3]	Total [m3]	PW 5 [m3]	PW 61 [m3]	PW 62 [m3]	PW 63 [m3]	PW 64 [m3]	Total [m3]	ZV A/D/P Kägen [m3]	Arlesheim Widenhof [m3]	IWB Pleuger [m3]	IWB Drissel [m3]	HAWAG Widenhof [m3]	HAWAG Bruderholz [m3]	Total [m3]	[m3]
Januar	76338.00	9798.00	37164.00	123'300	60'767	10'212	5'714	27'767	26'941	131'401	449	145	0	0	60'481	569	61'644	316'345
Februar	53'920	24'378	30'170	108'468	47'914	19'308	8'844	20'675	20'498	117'239	363	1	0	1	61'959	782	63'106	288'813
März	75'922	25'097	38'283	139'302	36'093	20'399	12'198	17'989	17'782	104'461	343	193	0	0	89'351	983	90'870	334'633
April	65'688	23'262	42'493	131'443	43'804	27'354	15'192	27'967	27'676	141'993	392	216	40	32	73'377	4'444	78'501	351'937
Mai	72'232	28'489	41'809	142'530	71'826	29'098	15'697	29'216	27'809	173'646	474	193	0	11	60'790	6'761	68'229	384'405
Juni	75'008	23'031	64'688	162'727	81'627	24'728	13'512	38'205	37'647	195'719	331	187	10	116	65'040	27'847	93'531	451'977
Juli	77'658	41'753	49'829	169'240	54'782	29'029	15'731	26'573	25'461	151'576	336	146	40	353	71'606	18'995	91'476	412'292
August	75'074	45'441	38'928	159'443	85'316	21'030	10'791	28'721	41'060	186'918	476	179	0	41	87'667	23'409	111'772	458'133
September	73'016	1	44'751	117'768	95'158	10'271	4'080	23'126	31'487	164'122	375	240	0	11	68'697	15'486	84'809	366'699
Oktober	75'136	16'760	46'811	138'707	72'055	24'345	13'639	29'980	29'568	169'587	196	147	0	0	61'390	15'182	76'915	385'209
November	69'264	4'860	40'410	114'534	57'959	7'711	4'255	23'883	23'385	117'193	2	145	0	185	88'349	22'692	111'373	343'100
Dezember	70'668	7'839	24'635	103'142	44'980	9'403	5'742	15'143	14'706	89'974	19'281	145	0	0	66'493	21'155	107'074	300'190
Total Jahr	859'924	250'709	499'971	1'610'604	752'281	232'888	125'395	309'245	324'020	1'743'829	23'018	1'937	90	750	855'200	158'305	1'039'300	4'393'733

Statistik:

2024	863'550	205'264	480'681	1'549'495	728'824	185'634	98'555	276'065	275'324	1'564'402	4'152	2'285	10	145	1'071'227	9'884	1'087'703	4'201'600
2023	863'508	337'525	580'741	1'781'774	692'734	242'849	129'602	313'489	342'579	1'721'253	3'467	2'020	60	279	1'044'923	16'949	1'067'698	4'570'725
2022	904'602	409'047	487'886	1'801'535	738'692	267'862	139'371	308'018	312'277	1'766'220	3'898	2'186	698	731	963'277	28'406	999'196	4'566'951
2021	868'242	358'265	634'211	1'860'718	523'906	157'662	105'877	285'259	396'765	1'469'469	2'500	1'999	525	80	1'027'923	13'200	1'046'227	4'376'414
2020	933'925	562'446	590'827	2'087'198	815'575	360'188	190'766	368'908	165'289	1'900'726	217	1'021	100	414	907'469	63'905	973'126	4'961'050
2019	935'310	428'377	745'569	2'109'256	754'211	256'970	152'608	260'542	163'368	1'587'699	164	-	-	456	824'188	74'460	899'268	4'596'223
2018	951'390	581'430	782'473	2'315'293	139'732	155'745	82'442	458'996	497'556	1'334'471	214	-	90	1'126	-	1'001'724	1'003'154	4'652'918
2017	941'466	623'468	863'147	2'428'081	157'517	111'712	81'709	347'165	378'146	1'076'249	46	-	67	343	-	1'000'606	1'001'062	4'505'392
2016	921'024	350'632	745'843	2'017'499	504'809	173'913	120'757	184'561	230'422	1'214'462	237	-	390	327	-	998'984	999'938	4'231'899
2015	862'094	458'647	902'432	2'223'173	614'814	228'486	176'242	252'577	267'306	1'539'425	527	-	930	22	-	739'377	740'856	4'503'454
2014	760'319	467'431	873'905	2'101'655	228'701	199'743	149'465	212'166	234'148	1'024'223	221	-	436	10	-	1'001'859	1'002'526	4'128'404
2013	674'131	541'090	1'093'546	2'308'767	637'877	251'819	187'186	276'626	367'017	1'720'525	720	-	28	1	-	158'766	159'515	4'188'807

Pumpenstunden

2025

2025	Reinacherheide Grundwasserpumpwerke 1-3				Reinacherheide Grundwasserpumpwerke 5, 6.1-6.4						ZV A/D/P Kägen	IWB Pleuger	HAWAG Untere Wanne			HAWAG Bruderholz				HAWAG Widenhof					Ettingen		
Monat	PW 1 [h]	PW 2 [h]	PW 3 [h]	Total [h]	PW 5 [h]	PW 61 [h]	PW 62 [h]	PW 63 [h]	PW 64 [h]	Total [h]	P 1 [h]	P 1 [h]	P 1 [h]	P 2 [h]	Total [h]	P 1 [h]	P 2 [h]	P 3 [h]	Total [h]	P 1 [h]	P 2 [h]	P 3 [h]	ARL P 3 [h]	Total [h]	P 1 [h]	P 2 [h]	Total [h]
Januar	667	89	310	1'066	370	103	97	285	282	1'138	0	0	1	1	2	1	1	0	2	52	75	37	1	165	42	40	82
Februar	472	261	255	987	295	194	149	218	219	1'076	0	0	1	1	2	1	1	1	2	84	42	42	0	167	37	38	75
März	665	265	322	1'252	225	208	211	193	193	1'030	0	0	1	2	3	1	1	1	3	63	62	116	1	242	42	44	86
April	576	262	358	1'196	271	278	264	297	297	1'407	0	0	10	4	13	1	12	1	13	76	74	48	1	199	42	39	81
Mai	636	302	338	1'275	444	299	275	312	302	1'631	0	0	12	9	20	3	10	7	20	44	37	83	1	166	46	42	89
Juni	661	240	510	1'411	498	248	226	393	394	1'759	0	33	37	43	80	9	59	7	75	70	90	7	1	169	49	47	96
Juli	684	386	399	1'469	340	295	271	281	274	1'461	0	0	19	36	56	28	18	9	56	73	89	31	1	194	47	47	94
August	662	426	322	1'410	522	214	187	300	429	1'652	0	0	47	22	69	22	31	16	69	106	62	68	1	237	54	49	103
September	644	0	382	1'026	577	103	67	238	328	1'314	0	0	24	22	46	21	15	10	46	73	73	39	2	187	40	38	78
Oktober	662	158	399	1'218	440	242	225	310	312	1'530	0	0	26	18	44	6	17	21	44	37	81	48	1	167	41	39	80
November	610	49	345	1'004	354	76	70	243	243	986	0	0	33	33	66	33	15	18	66	147	45	46	2	239	39	37	77
Dezember	618	81	211	909	274	92	92	155	153	766	0	0	31	31	62	25	22	15	62	58	74	48	1	180	39	36	76
Total Jahr	7'556	2'518	4'149	14'223	4'609	2'353	2'135	3'225	3'427	15'749	0	33	242	221	463	150	201	106	458	882	804	612	13	2'311	518	497	1'015

Statistik:

2024	7'547	2'196	3'786	13'529	4'449	1'888	1'685	2'894	2'930	13'846	0	0	14	14	29	10	10	9	29	991	980	915	15	2'902	473	450	922
2023	7'532	3'252	4'784	15'568	4'218	2'461	2'195	3'291	3'636	15'800	14	0	21	28	49	11	10	28	49	884	1'005	926	13	2'828	464	458	922
2022	7'836	3'974	4'283	16'093	4'724	2'667	2'266	3'186	3'288	16'131	17	1	31	51	82	21	30	29	80	828	879	885	14	2'607	496	482	978
2021	7'481	3'174	5'444	16'100	3'356	1'820	1'642	3'508	4'082	14'408	36	66	19	19	38	7	15	17	38	1'053	983	821	13	2'871	416	418	834
2020	8'035	5'167	5'296	18'499	6'274	4'309	2'894	4'752	1'693	19'921	1	0	91	95	186	8	88	101	197	730	787	928	8	2'453	468	450	919
2019	7'986	4'037	6'315	18'339	5'883	3'075	2'313	3'347	2'044	16'662	37	0	100	119	219	123	65	32	219	338	338	338	12	1'026	421	421	842
2018	8'028	4'803	6'947	19'778	1'122	1'842	1'231	5'733	6'118	16'046	-	-	-	-	0	967	873	1'070	2'910	-	-	-	-	0	-	-	0
2017	7'921	4'943	6'882	19'746	1'273	1'338	1'231	4'344	4'643	12'828	-	-	-	-	0	1'170	516	1'209	2'894	-	-	-	-	0	-	-	0
2016	7'721	2'755	5'226	15'702	3'903	2'069	1'799	2'334	2'831	12'936	-	-	-	-	0	968	894	1'039	2'901	-	-	-	-	0	-	-	0
2015	7'201	3'529	6'270	16'999	4'714	2'725	2'613	3'202	3'310	16'563	-	-	-	-	0	785	681	668	2'133	-	-	-	-	0	-	-	0
2014	6'324	3'498	5'985	15'808	1'717	2'348	2'158	2'654	2'873	11'750	-	-	-	-	0	991	830	1'044	2'866	-	-	-	-	0	-	-	0
2013	5'589	4'074	7'475	17'138	4'815	3'022	2'777	3'527	4'509	18'650	-	-	-	-	0	191	92	159	441	-	-	-	-	0	-	-	0

Maximale tägliche Fördermengen

2025



2025	Reinacherheide Grundwasserpumpwerke 1-3				Reinacherheide Grundwasserpumpwerke 5, 6.1-6.4						ZV A/D/P Kägen	IWB Pleuger	HAWAG Bruderholz	HAWAG Widenhof	WWR
Monat	PW 1 [m³]	PW 2 [m³]	PW 3 [m³]	Total [m³]	PW 5 [m³]	PW 61 [m³]	PW 62 [m³]	PW 63 [m³]	PW 64 [m³]	Total [m³]	P 1 [m³]	P 1 [m³]	P 1 - P 3 [m³]	P 1 - P 3, ARL P 3 [m³]	Gesamt [m³]
Januar	2'564	2'650	2'112	6'184	3'978	1'746	1'054	2'102	2'062	10'069	92	48	196	4'729	16'503
	14.01.2025	28.01.2025	11.01.2025	28.01.2025	23.01.2025	18.01.2025	18.01.2025	11.01.2025	11.01.2025	18.01.2025	17.01.2025	13.01.2025	19.01.25	26.01.2025	25.01.2025
Februar	2'546	1'996	2'541	6'933	3'458	2'437	1'479	1'661	1'632	9'998	94	0	201	5'614	18'096
	04.02.2025	01.02.2025	01.02.2025	01.02.2025	01.02.2025	08.02.2025	08.02.2025	15.02.2025	15.02.2025	08.02.2025	28.02.2025	01.02.2025	09.02.2025	16.02.2025	22.02.2025
März	2'528	2'412	2'897	7'733	3'191	1'727	1'027	1'691	1'666	9'117	90	0	200	8'981	18'139
	26.03.2025	23.03.2025	23.03.2025	23.03.2025	01.03.2025	29.03.2025	29.03.2025	15.03.2025	15.03.2025	01.03.2025	14.03.2025	01.03.2025	02.03.2025	23.03.2025	01.03.2025
April	2'644	1'603	2'941	6'101	3'965	1'741	1'040	1'996	1'642	9'874	112	20	2'714	5'616	18'342
	25.04.2025	19.04.2025	15.04.2025	19.04.2025	04.04.2025	19.04.2025	19.04.2025	19.04.2025	19.04.2025	05.04.2025	25.04.2025	24.04.2025	30.04.2025	20.04.2025	05.04.2025
Mai	2'564	2'309	2'703	7'552	3'976	2'141	1'262	2'048	2'023	10'967	93	0	1'324	5'615	22'216
	19.05.2025	31.05.2025	31.05.2025	31.05.2025	01.05.2025	31.05.2025	31.05.2025	31.05.2025	31.05.2025	31.05.2025	30.05.2025	01.05.2025	01.05.2025	18.05.2025	31.05.2025
Juni	2'596	2'593	3'116	8'065	4'014	2'511	1'572	2'414	2'375	10'972	87	10	6'216	5'562	22'467
	18.06.2025	28.06.2025	11.06.2025	28.06.2025	11.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	28.06.2025	13.06.2025	30.06.2025	09.06.2025	01.06.2025	30.06.2025
Juli	2'618	2'679	3'081	7'744	3'992	2'146	1'266	2'056	2'028	10'999	91	40	3'455	6'738	22'094
	03.07.2025	03.07.2025	10.07.2025	12.07.2025	17.07.2025	12.07.2025	12.07.2025	12.07.2025	12.07.2025	12.07.2025	25.07.2025	30.07.2025	03.07.2025	04.07.2025	12.07.2025
August	2'592	2'724	3'036	7'535	3'996	1'722	1'084	2'309	2'416	11'182	103	0	3'311	8'979	21'944
	08.08.2025	19.08.2025	11.08.2025	12.08.2025	20.08.2025	16.08.2025	02.08.2025	09.08.2025	22.08.2025	09.08.2025	29.08.2025	01.08.2025	19.08.2025	30.08.2025	16.08.2025
September	2'518	1	2'628	5'056	4'013	1'611	801	1'746	2'365	8'203	96	0	1'982	5'991	17'825
	11.09.2025	03.09.2025	09.09.2025	09.09.2025	23.09.2025	20.09.2025	14.09.2025	07.09.2025	28.09.2025	20.09.2025	19.09.2025	01.09.2025	23.09.2025	14.09.2025	07.09.2025
Oktober	2'524	2'035	2'861	6'521	4'013	1'740	1'044	1'822	1'781	8'915	90	0	1'357	6'737	18'615
	01.10.25	18.10.25	20.10.25	19.10.25	29.10.2025	11.10.2025	11.10.2025	27.10.2025	27.10.2025	11.10.2025	10.10.2025	01.10.2025	25.10.2025	26.10.2025	23.10.2025
November	2'528	1'133	2'880	5'536	3'883	1'773	1'084	2'351	2'300	8'534	1	0	2'015	8'422	22'099
	27.11.2025	22.11.2025	04.11.2025	22.11.2025	02.11.2025	15.11.2025	15.11.2025	02.11.2025	02.11.2025	02.11.2025	03.11.2025	01.11.2025	27.11.25	02.11.2025	02.11.2025
Dezember	2'546	868	2'046	5'073	2'993	1'780	1'086	1'716	1'679	6'249	6'151	0	1'453	6'709	15'905
	23.12.2025	17.12.2025	27.12.2025	20.12.2025	04.12.2025	27.12.2025	27.12.2025	06.12.2025	06.12.2025	06.12.2025	10.12.2025	01.12.2025	13.12.2025	28.12.2025	13.12.2025

Maximum	2'644	2'724	3'116	8'065	4'014	2'511	1'572	2'414	2'375	10'999	112	48	6'216	8'981	22'467
Tag	25.04.2025	19.08.2025	11.06.2025	28.06.2025	11.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	12.07.2025	25.04.2025	13.01.2025	09.06.2025	23.03.2025	30.06.2025

Statistik:

2024	2'748	2'529	3'144	8'192	4'006	2'419	1'439	2'396	2'350	10'180	108	0	717	8'980	23'488
2023	2'666	2'975	3'281	8'684	4'015	2'535	1'283	2'331	2'437	11'517	112	30	2'968	8'980	24'091
2022	2'680	3'054	3'189	8'154	3'828	2'488	1'565	2'399	2'351	11'884	105	120	3'489	8'979	26'104

Maximale und minimale Gemeindebezüge

2025

2025	Maximale Gemeindebezüge							Minimale Gemeindebezüge							Gesamtverbrauch VWR	
Monat	Reinach [m³]	Oberwil [m³]	Therwil [m³]	Biel-Benken [m³]	Bottmingen [m³]	Ettingen [m³]	Total [m³]	Reinach [m³]	Oberwil [m³]	Therwil [m³]	Biel-Benken [m³]	Bottmingen [m³]	Ettingen [m³]	Total [m³]	Maximum [m³]	Minimum [m³]
Januar	5'442	2'084	1'845	711	1'430	1'116	11'719	3'158	1'695	1'517	568	956	794	8'688	16'503	6'417
	13.01.2025	05.01.2025	05.01.2025	27.01.2025	24.01.2025	28.01.2025	13.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	25.01.2025	27.01.2025
Februar	3'734	2'068	1'775	739	1'380	1'027	10'408	3'273	1'896	1'628	632	1'069	896	9'884	18'097	3'501
	07.02.2025	16.02.2025	16.02.2025	03.02.2025	09.02.2025	02.02.2025	09.02.2025	01.02.2025	06.02.2025	06.02.2025	13.02.2025	25.02.2025	06.02.2025	25.02.2025	22.02.2025	10.02.2025
März	3'743	2'220	1'943	760	1'556	996	10'786	3'164	1'797	1'564	568	982	771	8'921	18'139	7'037
	18.03.2025	27.03.2025	26.03.2025	22.03.2025	22.03.2025	31.03.2025	22.03.2025	10.03.2025	10.03.2025	10.03.2025	26.03.2025	04.03.2025	10.03.2025	10.03.2025	01.03.2025	31.03.2025
April	4'673	2'723	2'548	1'091	2'764	1'227	13'489	3'241	1'892	1'591	635	1'260	815	9'899	18'342	5'582
	22.04.2025	11.04.2025	30.04.2025	30.04.2025	22.04.2025	11.04.2025	30.04.2025	21.04.2025	21.04.2025	20.04.2025	18.04.2025	16.04.2025	17.04.2025	21.04.2025	05.04.2025	13.04.2025
Mai	6'072	2'840	2'453	1'206	2'100	1'179	15'116	3'396	2'048	1'727	677	1'470	864	10'221	20'872	8'655
	02.05.2025	31.05.2025	30.05.2025	31.05.2025	16.05.2025	18.05.2025	02.05.2025	06.05.2025	06.05.2025	06.05.2025	07.05.2025	25.05.2025	06.05.2025	06.05.2025	31.05.2025	09.05.2025
Juni	6'502	3'762	3'428	2'021	2'692	1'944	19'031	3'200	2'018	1'812	698	1'229	866	10'094	19'031	10'094
	25.06.2025	30.06.2025	25.06.2025	28.06.2025	29.06.2025	27.06.2025	25.06.2025	08.06.2025	04.06.2025	08.06.2025	04.06.2025	07.06.2025	07.06.2025	08.06.2025	25.06.2025	08.06.2025
Juli	6'330	3'784	3'443	1'942	2'918	1'920	19'991	3'340	2'098	1'633	685	1'389	822	10'216	22'095	6'337
	02.07.2025	02.07.2025	01.07.2025	01.07.2025	01.07.2025	01.07.2025	02.07.2025	21.07.2025	29.07.2025	28.07.2025	27.07.2025	29.07.2025	08.07.2025	27.07.2025	12.07.2025	17.07.2025
August	6'018	3'934	3'337	1'811	3'063	1'694	19'012	3'074	1'967	1'608	683	1'308	871	9'568	19'012	9'568
	17.08.2025	13.08.2025	15.08.2025	15.08.2025	13.08.2025	13.08.2025	13.08.2025	02.08.2025	02.08.2025	02.08.2025	01.08.2025	02.08.2025	01.08.2025	02.08.2025	13.08.2025	02.08.2025
September	4'034	2'380	1'906	906	1'695	1'091	11'791	3'188	1'882	1'627	634	1'193	887	9'531	17'826	7'866
	19.09.2025	19.09.2025	20.09.2025	19.09.2025	07.09.2025	09.09.2025	19.09.2025	28.09.2025	30.09.2025	28.09.2025	28.09.2025	30.09.2025	30.09.2025	28.09.2025	07.09.2025	26.09.2025
Oktober	3'690	2'266	1'796	758	1'360	973	10'636	3'182	1'850	1'604	614	1'094	832	9'459	18'616	6'605
	14.10.2025	12.10.2025	21.10.2025	18.10.2025	17.10.2025	12.10.2025	19.10.2025	04.10.2025	04.10.2025	04.10.2025	04.10.2025	02.10.2025	08.10.2025	04.10.2025	18.10.2025	06.10.2025
November	4'565	2'496	1'856	714	1'447	940	10'749	3'257	1'767	1'494	557	816	787	9'686	22'099	7'011
	06.11.2025	05.11.2025	09.11.025	23.11.2025	24.11.2025	03.11.2025	23.11.2025	29.11.2025	06.11.2025	06.11.2025	06.11.2025	11.11.2025	06.11.2025	22.11.2025	02.11.2025	07.11.25
Dezember	3'617	2'137	1'785	981	1'303	942	10'159	3'121	1'696	1'535	601	965	813	8'890	15'905	6'971
	12.12.2025	10.12.2025	11.12.2025	08.12.2025	03.12.2025	14.12.2025	03.12.2025	09.12.2025	26.12.2025	30.12.2025	28.12.2025	29.12.2025	30.12.2025	30.12.2025	13.12.2025	01.12.2025

Maximum	6'502	3'934	3'443	2'021	3'063	1'944	19'991								22'099	
Tag	25.06.2025	13.08.2025	01.07.2025	28.06.2025	13.08.2024	27.06.2025	02.07.2025								02.11.2025	
Minimum								3'074	1'695	1'494	557	816	771	8'688		3'501
Tag								02.08.2025	01.01.2025	06.11.2025	06.11.2025	11.11.2025	10.03.2025	01.01.2025		10.02.2025

Statistik:

2024	5'263	4'605	3'564	1'630	2'807	1'465	17'918								23'488	
								2'964	1'677	1'462	574	933	739	8'527		4'500
2023	6'192	4'355	4'089	2'063	3'045	1'558	21'079								24'091	
								2'916	1'691	1'485	551	917	734	8'416		6'615

Extreme seit 1983: **32'500** **3'500**

Betriebsergebnisse

2025

Geförderte Wassermenge										
	Einheit	Reinacherheide		ZV A/D/P Kägen	IWB Pleuger	HAWAG Untere Wanne	HAWAG Bruderholz	HAWAG Widenhof	Ettingen (Hochzone)	Total
		PW 1 - PW 3	PW 5 - PW 64	P 1	P 1	P 1 + P 2	P 1 - P 3	P 1 - P 3, ARL P 3	P 1 + P 2	2025 2024
Geförderte Wassermenge	[m ³]	1'610'604	1'743'829	23'018	90	158'305		855'200	42'477	4'433'523 4'239'285
Stromverbrauch HT	[kWh]	254'063	214'399				3'385	13'838	3'018	488'703 424'309
Stromverbrauch NT	[kWh]	535'277	1'016'597				29'849	248'198	27'002	1'856'923 1'694'642
Stromverbrauch HT + NT	[kWh]	789'340	1'230'996				33'234	262'036	30'020	2'345'626 2'118'951
Stromkosten	[Fr.]	134'360	109'926				6'247	39'952	8'278	298'763 307'547
Pumpenstunden	[h]	13'529	15'749		33	463	458	2'311	1'015	33'558 31'258
Mittl. Preis pro kWh	[Fr./kWh]	0.170	0.089				0.188	0.152	0.276	0.127 0.145
Mittl. Energiebedarf	[kWh/m ³]	0.490	0.706				0.210	0.306	0.707	0.529 0.500
Mittl. Energiekosten pro m ³	[Fr./m ³]	0.083	0.063				0.039	0.047	0.195	0.067 0.073
Mittl. Energiekosten pro Betriebsstunde	[Fr./h]	9.931	6.980				13.641	17.291	8.154	8.903 9.839
Mittl. Leistung pro Betriebsstunde	[m ³ /h]	119.0	110.7		2.7	341.8	345.7	370.1	41.8	132.1 135.6

Mittlere Gesamtkosten pro m ³ verteiltes Wasser				
Verbrauch der WWR Gemeinden	[m ³]		4'101'697.00	3'910'851
Aufwand 1 = Gesamtaufwand, abzüglich Entgelte des WHL und ZV A/D/P	[Fr.]		3'747'245	3'777'677
Mittlere Kosten (1) pro m ³	[Rp./m ³]		91.4	96.6
Aufwand 2 = Gesamtaufwand, abzüglich Entgelte des WHL und ZV A/D/P ohne Einlagen in Vorfinanzierung	[Fr.]		2'250'805	2'348'334
Mittlere Kosten (2) pro m ³	[Rp./m ³]		54.9	60.0
Aufwand 3 = Gesamtaufwand, abzüglich Entgelte des WHL und ZV A/D/P ohne Einlagen in Vorfinanzierung und planmässige Abschreibung	[Fr.]		1'896'158	2'031'613
Mittlere Kosten (3) pro m ³	[Rp./m ³]		46.2	51.9

Gesamtübersicht

2025


Wasserbilanz	2025		2024	
	[m ³]	[%]	[m ³]	[%]
Bezug Grundwasser, Reinacherheide	3'354'433	76.35	3'503'027	76.64
Bezug ZV A/D/P, Kägen	23'018	0.52	3'467	0.08
Bezug Arlesheim, Widenhof	1'937	0.04	2'020	0.04
Bezug IWB, Pleuger	90	0.00	60	0.00
Bezug IWB, Drissel	750	0.02	279	0.01
Bezug HAWAG, Widenhof	855'200	19.46	1'044'923	22.86
Bezug HAWAG, Bruderholz	158'305	3.60	16'949	0.37
Total Wasserförderung WWR	4'393'733	100.00	4'570'725	100.00
Abgabe WHL	155'042	53.09	252'715	57.40
Abgabe ZV A/D/P, Kägen	135'899	46.54	186'819	42.44
Abgabe Arlesheim, Widenhof	1'358	0.47	1'619	0.37
Abgabe IWB, Pleuger	330	0.11	343	0.08
Abgabe IWB, Drissel	2'548	0.87	311	0.07
Abgabe IWB, Widenhof	1'020	0.35	916	0.21
Abgabe Eigenverbrauch WWR	-4'161	-1.42	-2'488	-0.57
Total Wasserabgabe an Dritte	292'036	6.65	440'235	9.63

Total Verbrauch WWR Gemeinden	4'101'697	93.35	4'130'490	90.37
--------------------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------

Statistik	[m ³]	Datum	[m ³]	Datum
Maximale eigene Fördermenge pro Tag	22'467	30.06.2025	23'488	31.08.2024
Mittlerer Wasserverbrauch pro Tag	12'038		10'714	
Mittlerer Wasserverbrauch pro Kopf und Tag	0.204		0.182	
Spitzenverbrauch pro Tag	19'991	02.07.2025	17'918	13.08.2024
Spitzenverbrauch pro Kopf und Tag	0.338		0.305	
Minimalverbrauch pro Tag	8'688	01.01.2025	8'527	29.12.2024
Minimalverbrauch pro Kopf und Tag	0.147		0.145	

WWR Gemeinden	Einwohnerzahlen per 31.12.				Bezug der WWR Gemeinden					
	2025		2024		2025			2024		
	[Einwohner]	[%]	[Einwohner]	[%]	[m ³]	[%]	[L / E +Tag]	[m ³]	[%]	[L / E +Tag]
Reinach	21'048	35.59	20'305	34.80	1'388'081	33.84	180.68	1'387'408	33.59	380.11
Oberwil	11'542	19.51	11'585	19.85	818'437	19.95	194.27	859'361	20.81	235.44
Therwil	10'200	17.24	10'098	17.31	694'924	16.94	186.66	689'995	16.70	189.04
Biel-Benken	3'572	6.04	3'569	6.12	298'133	7.27	228.67	320'468	7.76	87.80
Bottmingen	7'114	12.03	7'109	12.18	541'156	13.19	208.41	528'851	12.80	144.89
Ettingen	5'672	9.59	5'684	9.74	360'966	8.80	174.36	344'407	8.34	94.36
Total Einwohner	59'148	100.00	58'350	100.00	4'101'697	100.00	195.51	4'130'490	100.00	188.61

Bezug der WWR Gemeinden

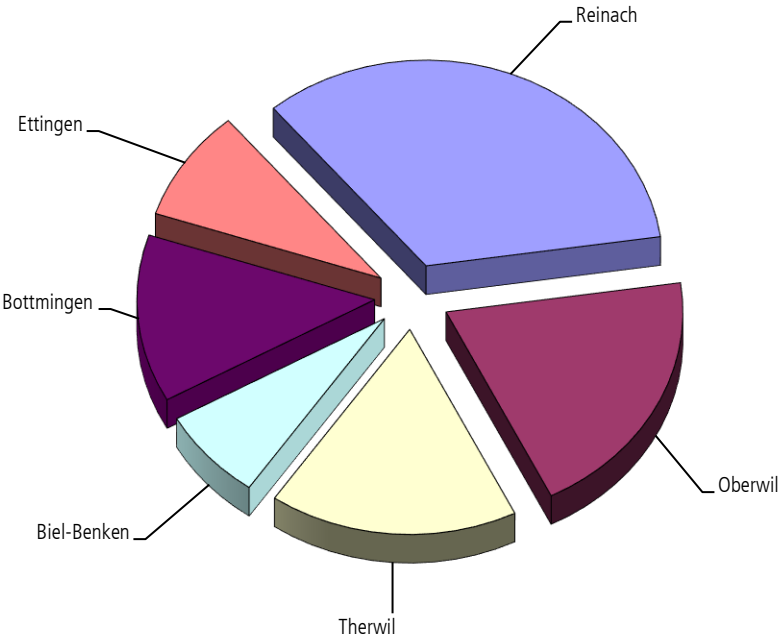


Kommentar:

Grundwasserpegel, Regenmenge Binningen, Birsabfluss Münchenstein,
Grundwasseranreicherung Aesch


2025

2025	Reinacherheide Grundwasserpegel								Regen- menge [mm]	mittlerer Birsabfluss [m ³ /s]	Anreicherungs- menge in Aesch [m ³]
Monat	PW 1 [m ü.M.]	PW 2 [m ü.M.]	PW 3 [m ü.M.]	PW 5 [m ü.M.]	PW 61 [m ü.M.]	PW 62 [m ü.M.]	PW 63 [m ü.M.]	PW 64 [m ü.M.]			
Januar	276.30	275.60	275.70	274.20	274.00	273.10	272.80	273.20	28.5	23.3	320'629
Februar	276.40	275.60	275.70	274.10	274.00	273.10	272.70	273.80	55.5	12.4	376'099
März	276.50	275.60	275.70	274.00	273.90	273.10	272.70	273.10	118.2	9.3	700'876
April	276.60	275.50	275.40	274.00	273.80	272.90	272.60	273.00	79.5	9.0	440'556
Mai	276.00	275.30	275.20	273.70	273.60	272.80	272.40	272.80	54.0	9.1	483'582
Juni	275.90	275.20	274.90	273.50	273.40	272.60	272.20	272.70	109.5	18.2	403'143
Juli	276.00	275.00	275.00	273.60	273.50	272.60	272.30	272.70	92.3	5.8	614'130
August	275.60	274.90	274.90	273.20	273.20	272.40	272.10	272.60	44.3	10.1	323'741
September	275.70	275.10	275.20	273.60	273.40	272.60	272.30	272.70	54.8	19.5	392'947
Oktober	276.30	275.40	275.40	273.80	273.70	272.80	272.40	272.90	72.0	15.0	310'521
November	276.20	275.50	275.40	274.00	273.80	273.00	272.70	273.10	190.9	29.9	288'749
Dezember	277.00	276.00	276.10	274.40	274.30	273.30	273.00	273.40	30.2	15.3	640'571
2025									929.7		5'295'544
2024									830.5		3'932'669
Monatsmittel 2025									77.5		441'295
Monatsmittel 2024									69.2		327'722
Mittel 2025	276.21	275.39	275.38	273.84	273.72	272.86	272.52	273.00			
Mittel 2024	276.24	275.48	275.66	274.08	273.98	273.12	272.88	273.14	64.5	13.4	14003 m3/Tg
Mittel 2023	276.24	275.48	275.59	273.92	273.98	273.15	272.83	273.14	64.5	13.4	14003 m3/Tg
Mittel 2022	276.43	275.64	275.69	273.26	274.12	273.30	273.08	273.21	66.3	11.7	15279 m3/Tg
Mittel 2021	276.67	275.77	275.85	273.53	274.44	273.50	273.45	273.41	77.0	19.1	11'486 m3/Tg
Mittel 2020	276.24	275.50	275.48	273.05	274.12	273.22	273.18	273.20	65.5	11.9	14'602 m3/Tg
Mittel 2019	276.25	275.48	275.58	273.17	274.23	273.28	273.22	273.26	58.1	12.8	10'692 m3/Tg
Mittel 2018	276.08	275.55	275.69	273.26	274.22	273.30	273.19	273.33	63.8	9.7	13'087 m3/Tg
Mittel 2017	276.64	275.86	275.99	273.54	274.48	273.44	273.46	273.68	83.1	17.3	9'456 m3/Tg
Mittel 2016	276.30	275.58	275.65	273.24	274.21	273.35	273.25	273.42	53.8	12.3	10'512 m3/Tg
Mittel 2015	276.40	275.62	275.73	273.29	274.28	273.46	273.36	273.44	72.4	14.6	7'262 m3/Tg
Mittel 2014	276.69	275.87	275.88	274.45	274.48	273.73	273.53	273.72	75.1	20.6	5'591 m3/Tg
Mittel 2013	276.63	275.83	276.03	274.56	274.00	273.73	273.53	273.68	87.0	20.7	6'150 m3/Tg


Wasserdargebot Birs

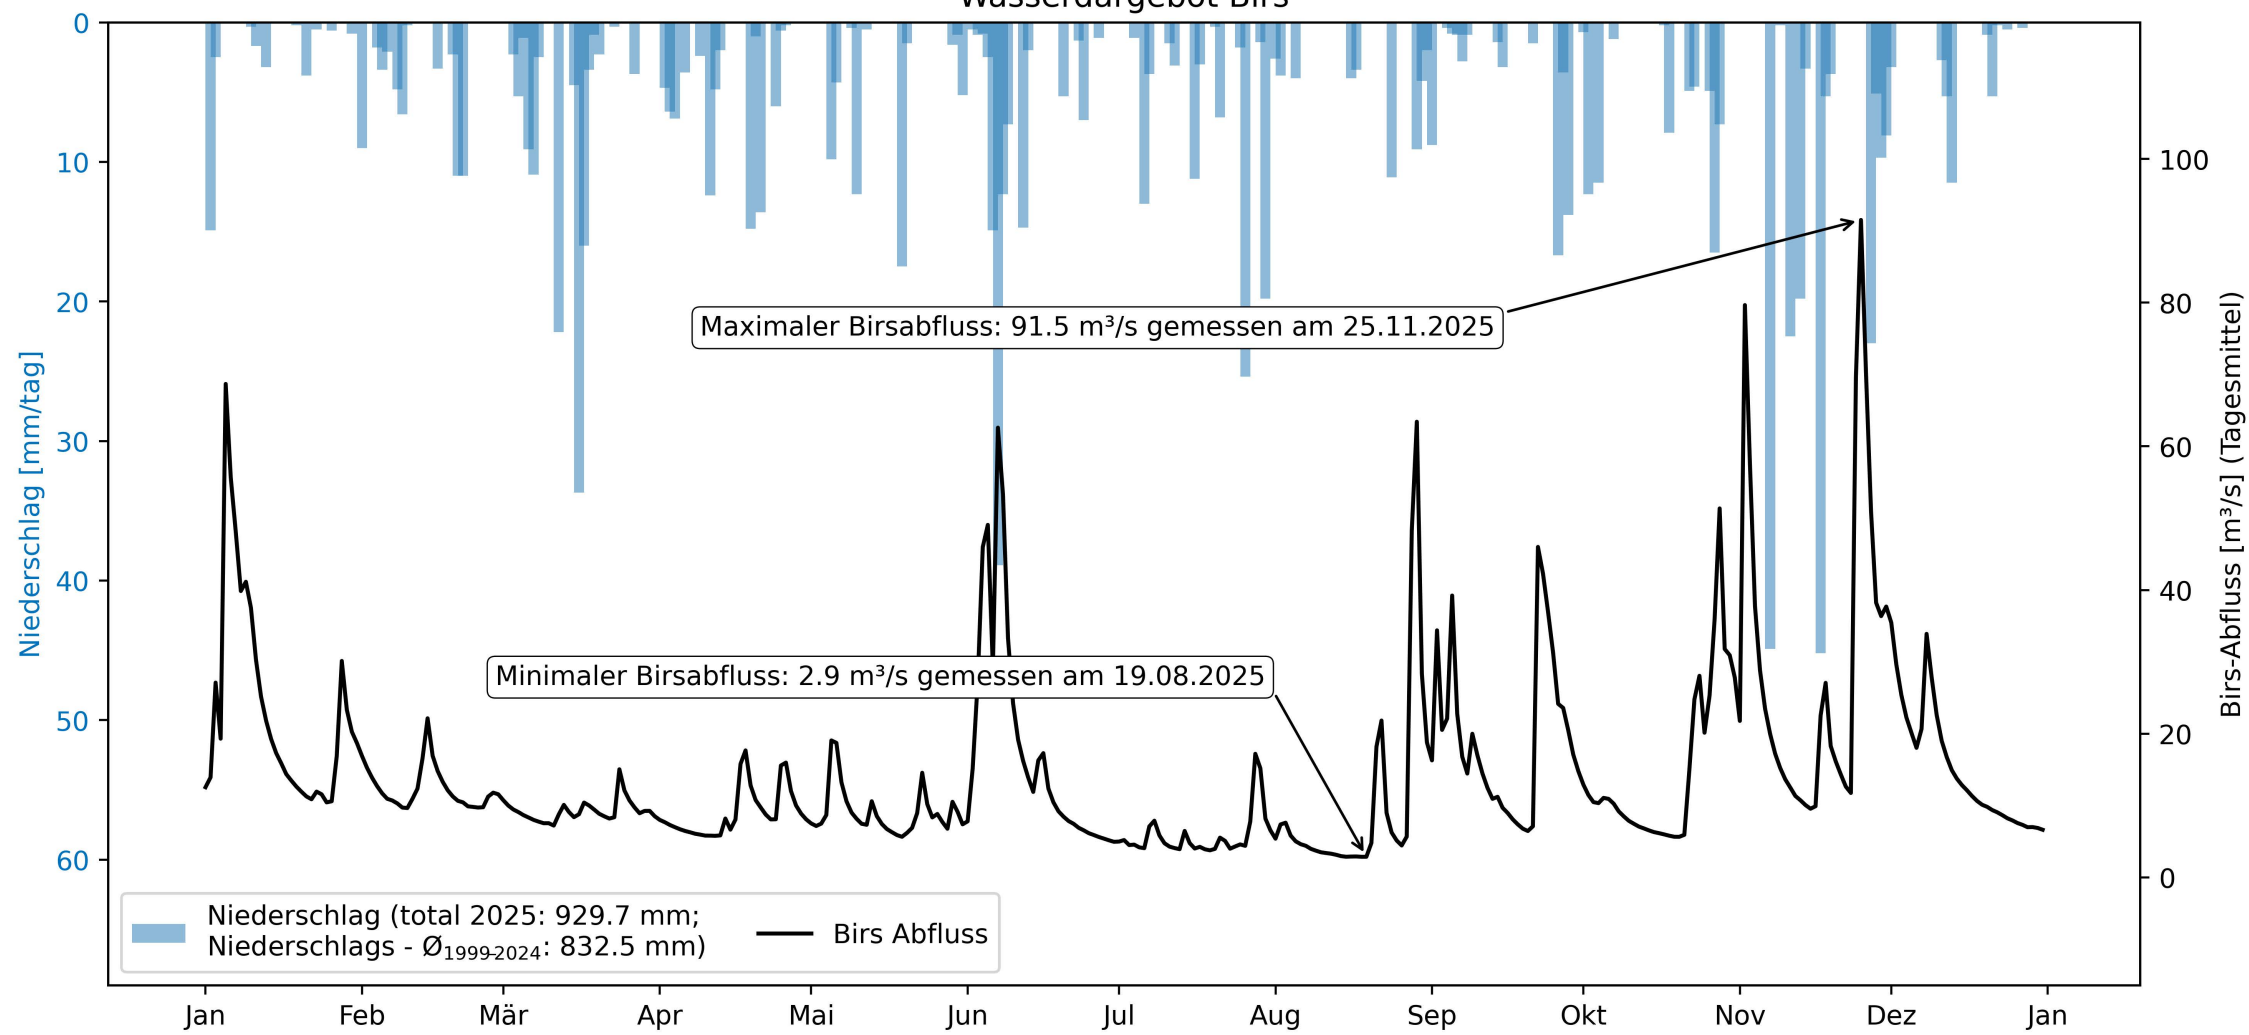


Versickerung Aesch und Pumpwerke Reinacher Heide

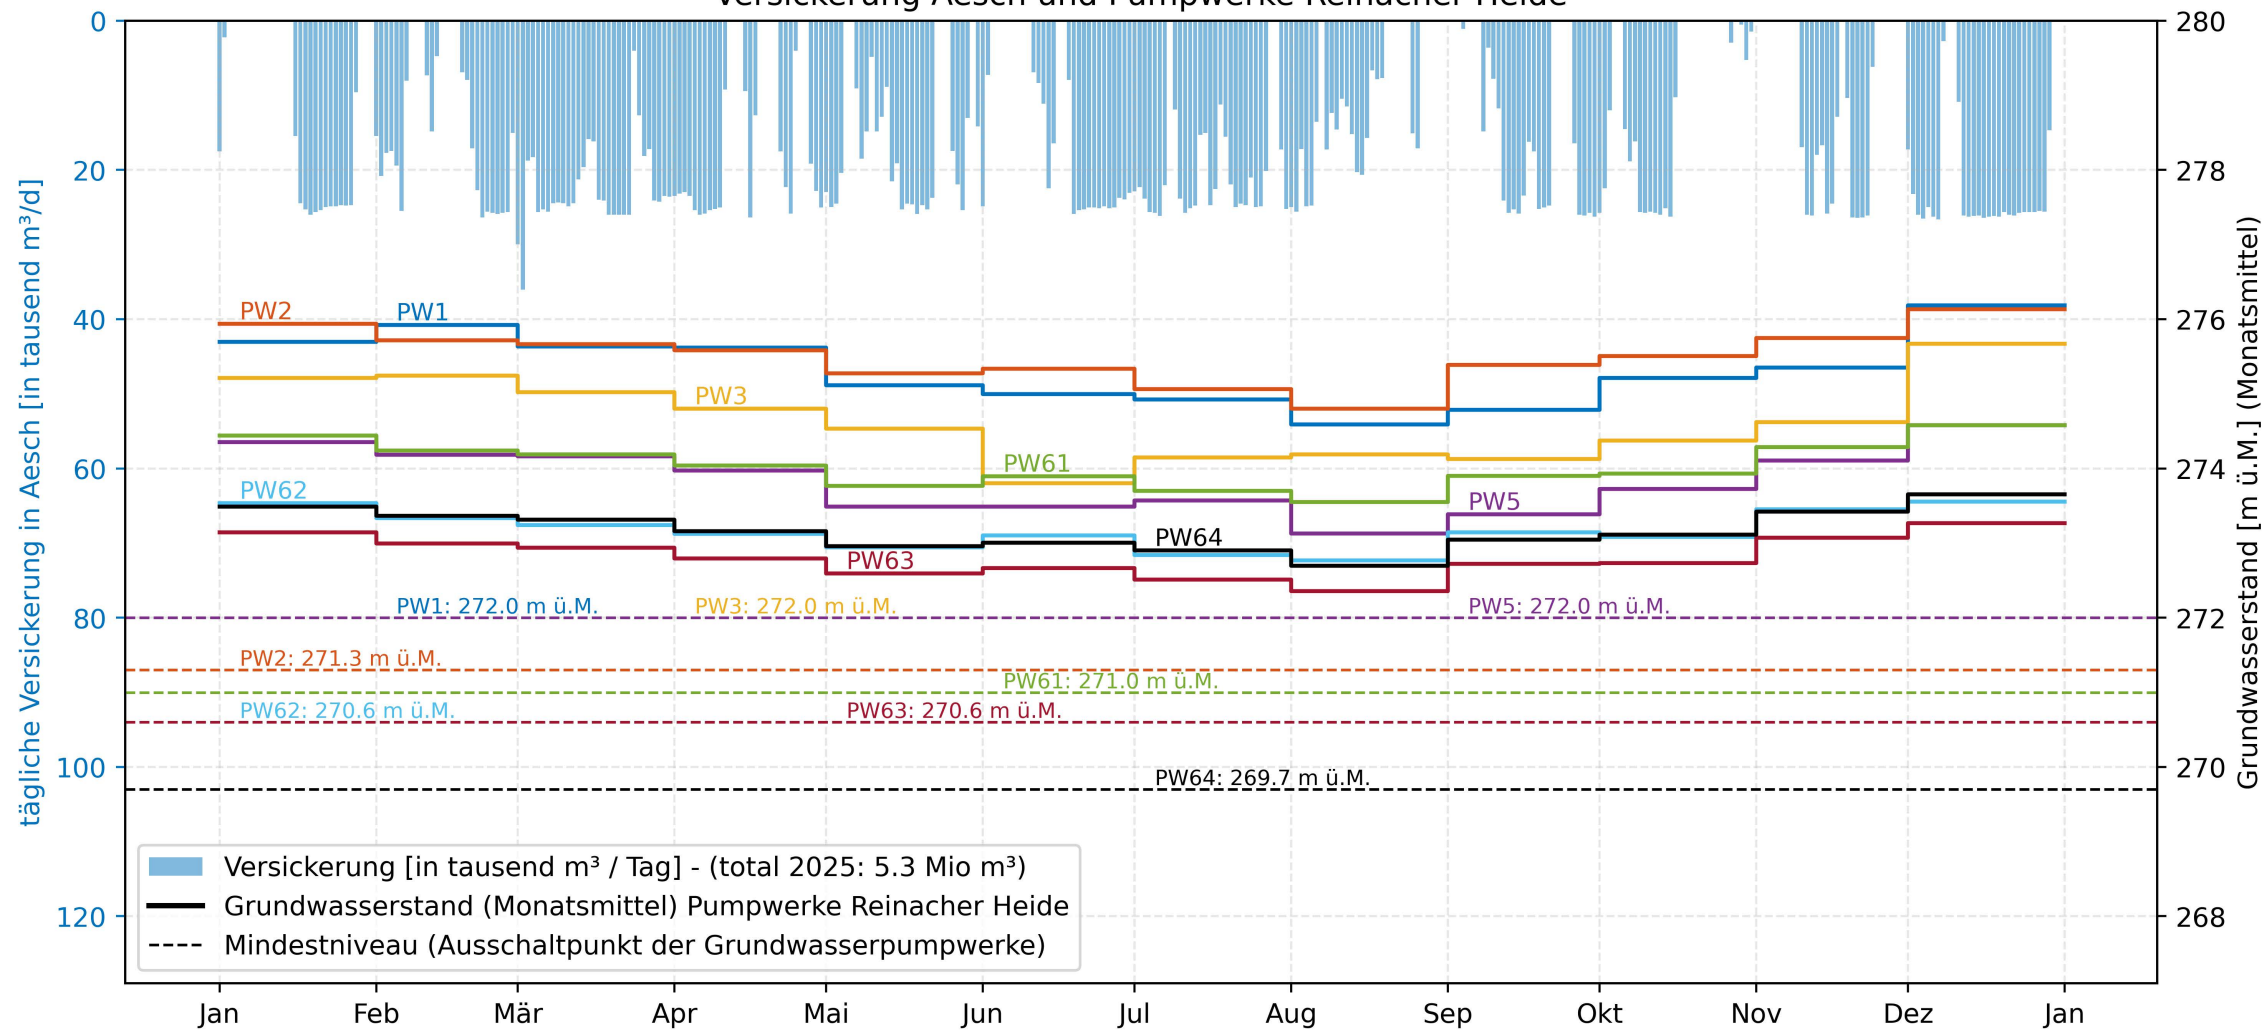

Langzeitentwicklung: Produktion und Verbrauch

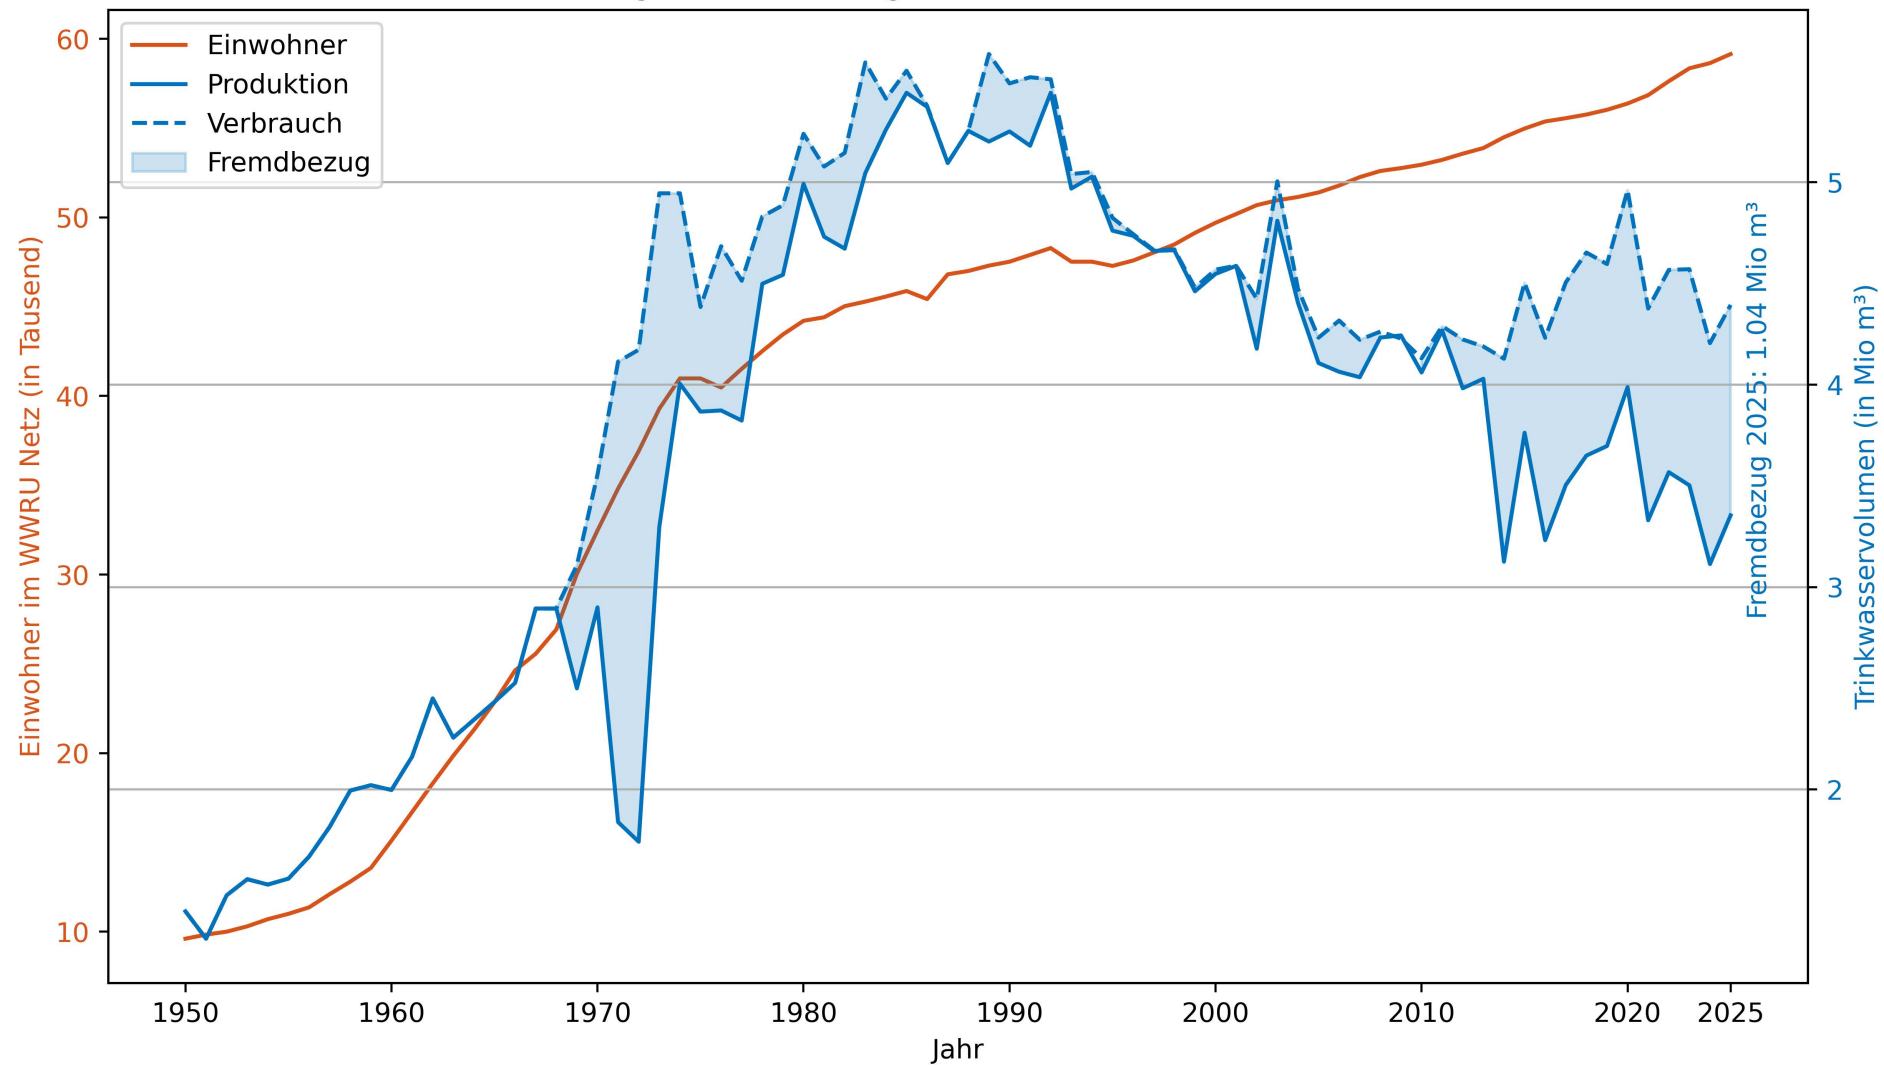

Langzeitentwicklung: Pro-Kopf- und Tagesverbrauch

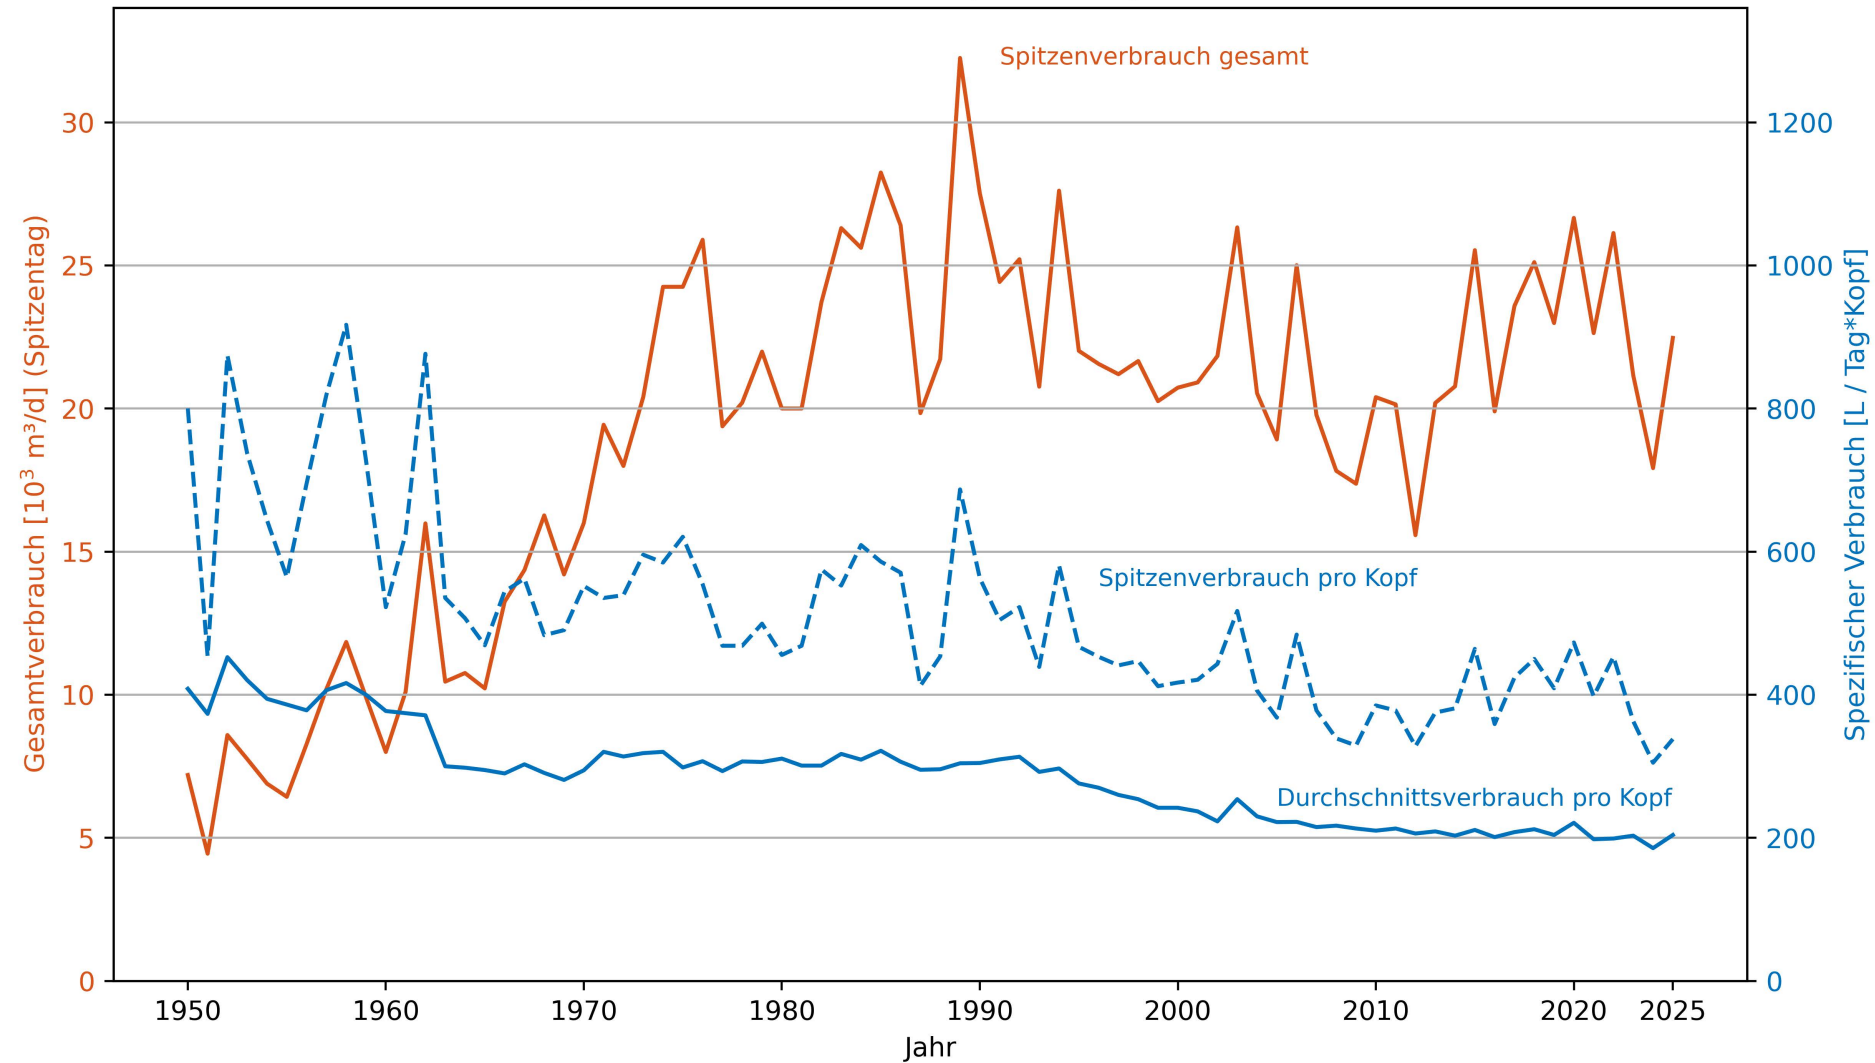

Versickerungsanlage Aesch - Betrieb 2025

Niederschlag [mm/tag]

- Niederschlag (total 2025: 929.7 mm; Niederschlags - $\bar{\text{Ø}}_{1999-2024}$: 832.5 mm)
- Birs Abfluss
- Versickerung (total 2025: 5.3 Mio m³)

Birs-Abfluss [m³/s] (Tagesmittel)

Versickerte Wassermenge [in tausend m³/d]

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

0

10

20

30

40

50

60

100

80

60

40

20

0



Wasserwerk Reinach und Umgebung
c/o Gemeinde Reinach
Hauptstrasse 10
4153 Reinach

Telefon: 061 511 62 11

www.wwr.ch
wasser@wwr.ch
